

УТВЕРЖДЕН
коллегией Фонда
«09» июня 2016 года (протокол № 54)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Владимирской области»
за 2015 год**



г. Владимир
2016 г.

№ п/п	Оглавление	стр.
1.	Цели и основные направления деятельности Фонда в 2015 году	3
2.	Актуализация долгосрочной региональной программы капитального ремонта на 2014-2043 гг.	5
3.	Реализация краткосрочных планов:	8
3.1.	Выполнение краткосрочного плана капитального ремонта 2014 года.	11
3.2.	Выполнение краткосрочного плана капитального ремонта 2015 года.	13
4.	Подготовка краткосрочного плана капитального ремонта на 2016 год	19
5.	Финансирование деятельности регионального оператора:	22
5.1.	Сведения о специальных счетах, владельцем которых определен региональный оператор	26
5.2.	Основные показатели работы расчетно-финансового отдела	28
5.3.	Сведения о размещении временно свободных денежных средств	29
5.4.	Расходование ежегодного имущественного взноса, полученного от учредителя Фонда	31
6.	Информирование населения области о функционировании региональной системы капитального ремонта	33
7.	Приложения к отчету:	37
7.1.	Приложение № 1 (перечень сданных в 2015 году объектов по краткосрочному плану 2014 года)	
7.2.	Приложение № 2 (перечень сданных в 2015 году объектов по краткосрочному плану 2015 года)	
7.3.	Приложение № 3 (фотоотчет)	
7.4.	Приложение № 4 (аудиторское заключение)	
7.5.	Приложение № 5 (отчет об использовании субсидии)	



1. Цели и основные направления деятельности Фонда в 2015 году

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» (далее – Фонд, региональный оператор) создана в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области» и постановлением Губернатора Владимирской области от 15.04.2013 № 427 «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области».

Основными направлениями деятельности Фонда в 2015 году являлись:

- 1) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области
- 2) организация системы сбора платежей (взносов) с населения на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;
- 3) оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи собственникам общего имущества в МКД, а также специалистам органов местного самоуправления по вопросам организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Основной целью деятельности Фонда является организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Владимирской области, а также развитие и бесперебойное функционирование системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона.

Для реализации основных направлений деятельности регионального оператора, им последовательно выполнялись следующие мероприятия:



- исполнение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- организация системы начислений и сбора средств собственников в виде взносов на капитальный ремонт;
- проведение капитального ремонта на домах, включенных в краткосрочные планы и формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора;
- осуществление подготовки к реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году;
- проведение информационно-разъяснительной работы с собственниками многоквартирных домов;
- обеспечение выполнения мероприятий по получению финансовой поддержки за счет государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2. Актуализация долгосрочной региональной программы капитального ремонта на 2014-2043 гг.



За 2015 год Фондом совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области было проведено 4 актуализации долгосрочной региональной программы капитального ремонта:

1. Постановление администрации Владимирской области от 19.06.2015 №577 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»;

2. Постановление администрации Владимирской области от 18.08.2015 №812 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»»;

3. Постановление администрации Владимирской области от 15.10.2015 №1031 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»»;


4. Постановление администрации Владимирской области от 21.12.2015 №1264 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»».

Необходимость актуализации региональной программы капитального ремонта в 2015 году была обусловлена следующими факторами:

- исключением аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов в количестве 84 единицы,
- исключением из программы жилых домов блокированной застройки в количестве 123 единицы,
- добавлением ранее не внесенных в программу многоквартирных домов в количестве 111 единиц.



По состоянию на 31.12.2015 года в региональную программу капитального ремонта включено 11 474 многоквартирных дома, в которых за время действия программы планируется выполнить 48 774 вида работ, из них 12 392 – капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, 11 474 – капитальный ремонт крыши, 10 488 – капитальный ремонт фундамента, 9 212 – капитальный ремонт фасада, 5 395 – капитальный ремонт подвала, 1 124 – капитальный ремонт лифтов.

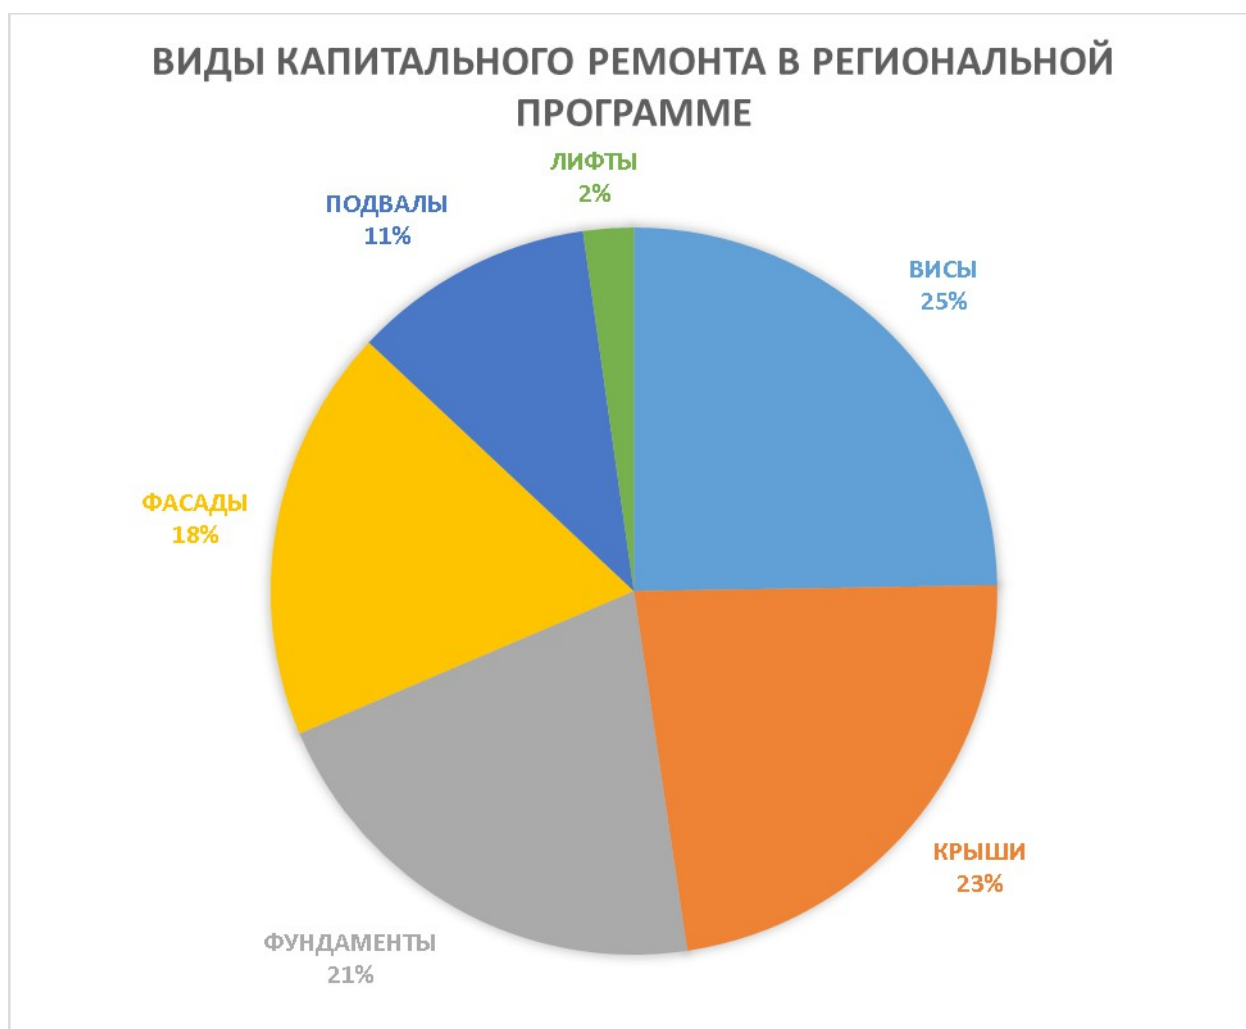

Общая площадь многоквартирных домов по региональной программе составляет 25 431,21 тыс.кв.м.

На протяжении всего отчетного периода проводилась работы по обновлению сведений в электронных паспорта многоквартирных домов, занесенных в информационную систему «ЖКХ-33».



По состоянию на 31.12.2015 года из 11474 многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, по 6 315 многоквартирным домам электронный паспорт заполнен на 100%, по 3 973 многоквартирным домам электронный паспорт заполнен от 51% до 99%, по 1186 многоквартирным домам электронный паспорт заполнен менее чем на 50%.



3. Реализация краткосрочных планов.



В 2015 году была завершена реализация краткосрочного плана капитального ремонта 2014 года на многоквартирных домах, срок производства ремонта которых был перенесен на 2015 год.

В течение года были полностью завершены работы на 361 МКД (400 видов работ). (Перечень МКД программы 2014 года, принятые в 2015 году приведен в приложении №1 к настоящему отчету).

Фондом регулярно проводится корректировка несоответствий сведений в электронных паспортах домов, выявленных в ходе формирования региональной программы.

Также проводится работа по актуализации и корректировке информации содержащейся в информационной системе ИС ЖКХ-33, вносятся фотоотчеты объектов до и после капитального ремонта; графики производства работ; данные о приемке; ведение отчетов по строительному контролю.

Консультации граждан по вопросам капитального ремонта осуществляются через форму обратной связи на сайте Фонда, посредством подготовки ответов на письменные обращения, консультаций по телефону и электронной почте.

Основные темы обращений от собственников помещений касаются планируемого и уже выполненного ремонта; графиков производства работ, качества ремонта.

Сотрудниками службы заказчика были проведены плановые, внеплановые, приемочные, комиссионные выездные проверки качества и объемов выполняемых и ранее выполненных работ. Так, всего в 2015 году:

- на выездных проверках по программе 2015 года было проверено качество ремонта на 82 МКД;
- на выездных проверках по программе 2014 года было проверено качество ремонта на 40 МКД (54 вида работ);
- приемочные и повторные приемочные комиссии - 1169 выездов;



- комиссионные выезды по жалобам в количестве - 74 выезда;
- внеплановые проверки подрядных организаций – 92 выезда;
- внеплановые проверки строительного контроля – 43 выезда;
- рабочие совещания с собственниками, управляющими компаниями, представителями органов местного самоуправления, проведенные на территории муниципальных образований – 28 выездов.

В 2015 году путем конкурсных отборов были заключены договоры с организациями на осуществление функций строительного контроля по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Функции строительного контроля осуществлялись сотрудниками службы заказчика в муниципальных образованиях, где организация по осуществлению строительного контроля не была определена. Выполнение обязательств по договорам организациями строительного контроля также контролируется сотрудниками Фонда.

При приемке работ по капитальному ремонту по каждому виду работ многоквартирного дома собраны и проверены полные комплекты исполнительной документации, включающие в себя:

- общий журнал производства работ;
- акты скрытых работ;
- исполнительные схемы;
- акты испытаний;
- сертификаты качества и паспорта на примененные материалы и оборудование;
- справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);
- акты выполненных работ (форма КС-2);
- счета на оплату и счета-фактуры за выполненные работы;
- фотоматериалы начала и окончания работ.



В соответствии с регламентом взаимодействия управляющих компаний с Фондом копия исполнительной документации предоставляется в управляющие компании.

Сметной группой сотрудников отдела подготовки технической документации по программе 2015 года проверены - 666 дефектных ведомостей и 666 смет, по программе 2016 года проведена проверка – 705 дефектных ведомостей.

Вся сметная документация по завершению работ была проверена сотрудниками Фонда на правильность применения расценок и ресурсной части сметной документации.

Было разработано 10 проектов по капитальному ремонту фасадов, фундаментов, реконструкциям крыш.



3.1. Выполнение краткосрочного плана капитального ремонта 2014 года.

В соответствии с краткосрочным планом 2014 года в 2014-2015 годах был проведен капитальный ремонт в 497 многоквартирных домах, общей площадью 1 277,27 тыс. кв.м., расположенных на территории 85 муниципальных образований Владимирской области.

В результате выполнения краткосрочного плана 2014 года 49 917 граждан улучшили свои жилищные условия.

Мероприятия краткосрочного плана 2014 года были завершены и полностью оплачены до 31 декабря 2015 года.

Данные по объемам и видам работ сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование работ	Количество объектов
1	Внутридомовые инженерные системы	122
2	Лифтовое оборудование (ед. об.)	48
3	Крыши	352
4	Фасады	31
5	Подвалы	2
6	Фундаменты	5

Общий объем финансирования краткосрочного плана 2014 года составил 592 084, 40 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств Фонда - 85 491, 37 тыс. руб.;
- областного бюджета - 27 157, 32 тыс. руб.;
- местных бюджетов - 42 802, 04 тыс. руб.;
- средств собственников - 436 633, 67 тыс. руб.



Финансирование краткосрочного плана 2014 года



3.2. Выполнение краткосрочного плана капитального ремонта 2015 года

В краткосрочный план реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов во Владимирской области 2015 года было включено 624 МКД (666 видов работ), из которых:

- капитальный ремонт ВИС – 124 МКД;
- капитальный ремонт крыш – 449 МКД;
- капитальный ремонт лифтового оборудования – 24 МКД;
- капитальный ремонт фасадов – 48 МКД;
- капитальный ремонт фундамента – 1 МКД;
- капитальный ремонт подвала – 20 МКД.



Из них 6 МКД формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах и организуют свой ремонт самостоятельно. На конец отчетного



периода 2015 года работы завершены и приняты в полном объеме на 550 МКД (587 видов работ). (Перечень МКД программы 2015 года, принятые в 2015 году приведен в приложении №2 к настоящему отчету).

На основании решений, принятых на общих собраниях собственников помещений, в 107 МКД сроки проведения ремонта были перенесены на более поздний период, в 32 МКД изменены виды работ по капитальному ремонту, что потребовало внесения изменений в сводный краткосрочный план капитального ремонта на 2015 год. По 74 МКД торги не состоялись, в связи с отсутствием заявок и были перенесены на 2016 год.

После проведенных торгов, завершения строительно-монтажных работ, переноса сроков ремонта домов на более поздний срок образовалась экономия денежных средств, в связи с чем в региональную программу 2015 года было добавлено 37 МКД.

В 2015 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области осуществлялся в соответствии с краткосрочным планом, утвержденным постановлением администрации Владимирской области от 03.12.2014 №1236 «Об утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 год».

В 2015 году Фондом в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области были направлены предложения по корректировке краткосрочного плана в части:

- уточнения стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с фактической сметной стоимостью и договорами подряда, заключенными по итогам проведения торгов;
- исключения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых приняли



решение о переносе сроков капитального ремонта на более поздний период;

- включения дополнительных многоквартирных домов на экономию денежных средств, образовавшуюся в результате уточнения сметной стоимости работ, а так же по итогам проведения конкурсного отбора подрядчиков.

На основании представленных предложений были внесены изменения и дополнения в краткосрочный план в 2015 году в соответствии с постановлениями администрации Владимирской области № 40 от 03.02.2015 года; №541 от 08.06.2015 года, №903 от 14.09.2015 года; №1038 от 15.10.2015 года; №1266 от 21.12.2015 года.

Всего в 2015 году краткосрочным планом предусмотрены работы по проведению капитального ремонта общего имущества в 624 многоквартирных домах, из которых 74 многоквартирных дома с планируемым сроком реализации до 30.06.2016 года.

Проведение ремонтных работ предусмотрено по 661 объекту (618 домов), разработка проектной документации - по 6 объектам (6 домов).

Данные по объемам и видам работ сведены в таблицу 2.

Таблица 2.

Вид работ (объект капитального ремонта)	Предусмотрено краткосрочным планом в 2015 году	
	Объектов (домов)	Стоимость работ, руб.
Ремонт внутридомовых инженерных систем	124	82 745 425,91
Ремонт (замена) лифтов	57 ед. / 24 дома	100 528 290,00
Ремонт крыш	449	581 139 253,03
Ремонт подвальных помещений	15	4 137 121,33
Ремонт фасадов	48	41 296 425,40
Ремонт фундаментов	1	189 721,50
Другие виды (строительный контроль и разработка проектно-сметной документации)	10	16 122 269,08




Итого по области:

661

826 158 506,25

**В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2015 ГОДА БЫЛО
ВКЛЮЧЕНО 624 МКД (666 ВИДОВ РАБОТ),**

■ ВИС ■ ЛИФТЫ ■ КРЫШИ ■ ПОДВАЛЫ ■ ФАСАДЫ ■ ФУНДАМЕНТЫ

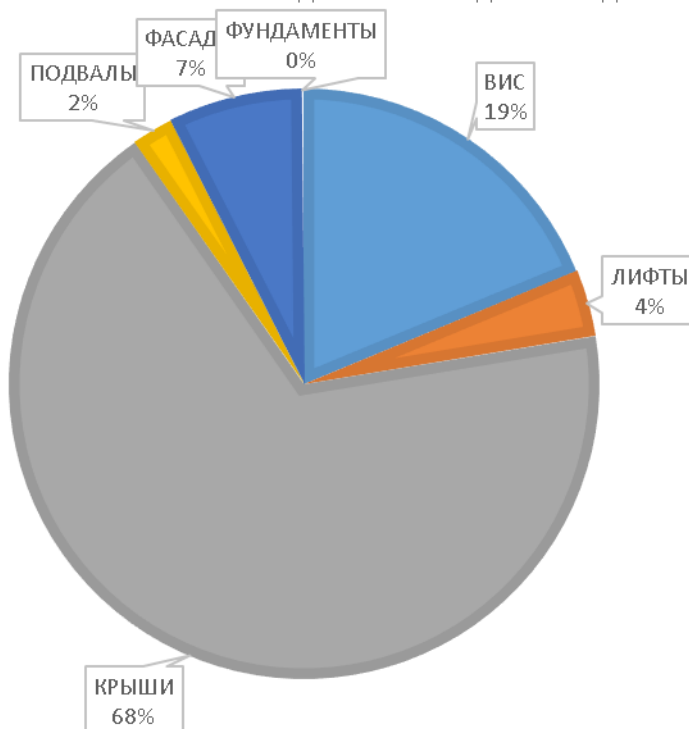

Основной объем финансовых средств направлен на выполнение капитального ремонта крыш – 70,34% (от общего объема средств), капитального ремонта лифтов – 12,74%, капитального ремонта внутридомовых инженерных систем – 10,02%. Остальные виды работ представлены в меньшем объеме.

В 2015 году финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлялось за счет 4-х источников в следующем соотношении:

- 12 213, 05 тыс. руб. – средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ,
- 15 518, 47 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 25 233, 03 тыс. руб. – средства местных бюджетов;



- 773 193, 96 тыс. руб. – средства собственников.

В рамках реализации краткосрочного плана Фондом в 2015 году проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации по 582 объектам в 545 домах.

По итогам торгов заключено 225 договоров с подрядными организациями для выполнения работ по капитальному ремонту в 545 многоквартирных домах.

По состоянию на 31 декабря 2015 года в полном объеме был завершен капитальный ремонт общего имущества в 550 многоквартирных домах, из которых 5 многоквартирных домов со способом формирования фонда капитального ремонта на специальном счете.

На всех объектах, капитальный ремонт в которых выполнен в 2015 году, в соответствии с заключенными договорами подряда с организациями, имеющих допуск СРО, производился строительный контроль.

Общая стоимость выполненных и принятых работ составила более 533 766 тыс. руб.

Ввиду того, что сроки реализации краткосрочного плана 2015 года были продлены до 30.06.2016 года, по переходящим на 2016 год 74 многоквартирным домам конкурсные торги по выбору подрядной организации и выполнение капитального ремонта планируется осуществить в первой половине 2016 года.

Так же, хочется отметить, что государственная корпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ на основе мониторинга публикует всероссийский рейтинг реализации программы капитального ремонта. Владимирская область в 2015 году заняла 12 место из 85 субъектов Российской Федерации.

Ранг субъектов сформирован на основе следующих показателей:



- качество планирования региональной программы капитального ремонта;
- доля обеспеченности финансовыми средствами работ (услуг) программы капитального ремонта;
- доля собираемости финансовыми средствами работ (услуг) программы капитального ремонта в текущем году;
- доля работ (услуг), фактически исполненных по договорам подряда.

Сравнительный анализ показателей выполнения работ по капитальному ремонту в 2014 и 2015 гг.

№ п/п	Показатели капитального ремонта	2014 год	2015 год
1	Количество муниципальных образований	85	93
2	Количество многоквартирных домов	497	624
3	Общая площадь многоквартирных домов, кв.м.	1 277 267,47	1 442 365,97
4	Количество жителей, которые улучшат жилищные условия	49 917	61 102
5	Стоимость капитального ремонта, млн. руб.	592,08	826,16



4. Подготовка краткосрочного плана капитального ремонта на 2016 год

В 2015 году проведена работа по согласованию муниципальных краткосрочных планов и формированию сводного краткосрочного плана на 2016 год.

При согласовании краткосрочных планов с органами местного самоуправления велась работа по уточнению площадей многоквартирных домов, учитываемых при определении предельной стоимости работ по капитальному ремонту объектов, включенных в краткосрочный план на 2016 год.

В целях подготовки краткосрочного плана на 2016 год, в установленные законом сроки, проводилась работа по формированию и направлению предложений собственникам помещений многоквартирных домов о проведении капитального ремонта:

- в 786 многоквартирных домов направлены предложения собственникам помещений о проведении капитального ремонта в 2016 году;

- направлен 21 запрос в администрации городских округов и муниципальных районов области на предоставление постановлений органов местного самоуправления о проведении капитального ремонта по предложениям, срок принятия решений по которым истек.

В адрес Фонда за отчетный период поступило 385 протоколов общих собраний собственников о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году, еще в отношении 115 многоквартирных домов решение о проведении капитального ремонта принято администрациями муниципальных образований.

В 2016 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 02.12.2015 №1198 «Об



утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2016 год».

Всего в 2016 году краткосрочным планом предусмотрены работы по проведению капитального ремонта общего имущества в 500 многоквартирных домах.

Общее число и виды запланированных работ на 2016 год в разрезе муниципальных районов представлено в таблице 3.

Таблица 3.

№	Район	Вид работ (объект капитального ремонта), шт.						Всего, шт.
		ВИС	Лифты	Крыши	Подвальные помещения	Фасады	Фундаменты	
1	город Владимир	20	0	73	1	9	1	104
2	город Гусь-Хрустальный	13	0	14	0	1	0	28
3	город Ковров	44	3 дома/ 11 ед.	6	0	3	0	56
4	округ Муром	1	7 домов / 22 ед.	22	0	1	0	31
5	ЗАТО город Радужный	5	0	15	0	0	0	20
6	Александровский район	11	2 дома/ 8 ед.	20	0	2	1	36
7	Вязниковский район	4	0	24	0	4	0	32
8	Гороховецкий район	0	0	10	0	1	3	14
9	Гусь-Хрустальный район	0	0	6	0	0	0	6
10	Камешковский район	3	0	7	0	0	0	10
11	Киржачский район	0	0	10	0	0	0	10
12	Ковровский район	4	0	3	0	1	0	8
13	Кольчугинский район	0	0	6	0	0	0	6
14	Меленковский район	0	0	4	0	1	0	5
15	Муромский район	0	0	2	0	0	0	2
16	Петушинский район	9	0	36	0	1	0	46
17	Селивановский район	1	0	2	0	0	0	3
18	Собинский район	8	0	21	3	0	2	34
19	Судогодский район	3	0	18	2	1	1	25
20	Суздальский район	0	0	5	0	1	0	6
21	Юрьев-Польский район	17	0	4	4	12	0	37
Итого по области:		143	12 домов/ 41 ед.	308	10	38	8	519



Плановая стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах программы 2016 года составляет 719 980, 16 тыс. руб.

Финансирование краткосрочного плана предусмотрено с использованием средств областного и местных бюджетов в соотношении в размере:

- 37 695, 73 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 38 963, 83 тыс. руб. – средства местных бюджетов.

В целях реализации краткосрочного плана на 2016 года проведена работа по получению от администраций муниципальных образований дефектных ведомостей по видам работ, включенных в краткосрочный план.

23 декабря 2015 года состоялся открытый конкурс по выбору подрядной организации по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов общего имущества многоквартирных домов, капитальный ремонт которых запланирован на 2016 год.



5. Финансирование деятельности регионального оператора

Основной задачей расчетно-финансового отдела Фонда в 2015 году являлась работа по учету начисленных и оплаченных взносов на капитальный ремонт, а также осуществление деятельности по учету способов формирования фондов капитального ремонта для многоквартирных домов Владимирской области.

В рамках данной задачи проведены следующие мероприятия:

- мониторинг деятельности ООО «ЕРИЦ Владимирской области» по начислению и оплате взносов на капитальный ремонт собственникам – физическим лицам;
- обмен информацией с ООО «ЕРИЦ Владимирской области» об изменениях в составе имущества, принадлежащего собственникам – физическим лицам, о платежах, произведенных собственниками по реквизитам регионального оператора;
- осуществление начислений, перерасчетов, учет оплат, сверка расчетов с прочими контрагентами, в том числе муниципальными образованиями и юридическими лицами. Учет изменений в составе помещений, являющихся муниципальной собственностью. Ежемесячное выставление и доставка счетов;
- экспорт данных о начисленных и оплаченных взносах муниципальными образованиями и юридическими лицами в систему АИС-ЖКХ 33;
- ведение учета денежных средств, поступающих на специальные счета регионального оператора, ведение учета денежных средств, списываемых со специальных счетов регионального оператора по актам выполненных работ;
- сверка данных с отделом бухгалтерского учета, касающихся сумм денежных средств, поступивших и списанных со счета регионального оператора и специальных счетов регионального оператора;



- формирование квартальной отчетности, предусмотренной п. 2 ст. 172 Жилищного Кодекса Российской Федерации;
- прием, проверка легитимности протоколов, касающихся изменения способа формирования фондов капитального ремонта, изменения владельцев специальных счетов, изменения размера взноса на капитальный ремонт;
- актуализация данных системы АИС ЖКХ-33, касающихся способов формирования фонда капитального ремонта, изменения владельца специального счета, изменения размера взноса на капитальный ремонт;
- информирование Государственной жилищной инспекции о принятых собственниками решениях, касающихся выбора способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является ТСЖ, ЖКС, УК;
- информирование собственников об указанных изменениях;
- осуществление зачетов ранее выполненных работ по капитальному ремонту, предусмотренных ст. 7 Закона Владимирской области от 06.11.2013 года № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»;
- формирование еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности, касающейся сумм начисленных и оплаченных взносов на капитальный ремонт всеми типами собственников (физические лица, муниципальные образования, юридические лица);
- претензионно – исковая деятельность (совместно с юридическим отделом): выявление собственников, имеющих пророченную задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт, составление и рассылка предсудебных уведомлений, подготовка документации для судебного взыскания задолженности;



- работа с корреспонденцией: ведение переписки с гражданами, органами местного самоуправления, контролирующими органами. Ведение системы делопроизводства отдела. Контроль за соблюдением сроков подготовки ответов на входящие письма и запросы;

- прием граждан, консультационная работа с посетителями и по телефону.

В 2015 году был создан программный комплекс по учету начисленных и оплаченных взносов на капитальный ремонт муниципальными образованиями и юридическими лицами, а также по учету средств на специальных счетах регионального оператора. В рамках данной задачи было выполнено следующее:

- разработка технического задания для создания программного комплекса, позволяющего осуществлять указанные выше задачи (январь 2015 года);

- поиск организации – разработчика программного комплекса, определение сроков реализации поставленных задач (январь-февраль 2015 года);

- контроль за соблюдением сроков реализации технического задания (март 2015 года);

- тестовый запуск программного комплекса «кАпилка», пробные работы по начисления и загрузке платежей (март 2015 года);

- запуск рабочей версии программного комплекса «кАпилка» (март 2015 года);

- внесение в программный комплекс сведений о контрагентах – муниципальных образованиях и юридических лицах, помещениях, находящихся в их собственности, реквизитах специальных счетов регионального оператора, принадлежности их к многоквартирным домам (март-апрель 2015 года);



- восстановление истории по начисленным и оплаченным взносам на капитальный ремонт указанными контрагентами за период с 1 апреля 2014 года (март-апрель 2015 года);
- восстановление истории по движениям денежных средств на счете регионального оператора, специальных счетах регионального оператора (март-апрель 2015 года).
- перенос программного комплекса с сервера разработчика на сервер, принадлежащий Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» (сентябрь 2015 года);
- автоматизация процесса экспорта сведений по начисленным и оплаченным взносам на капитальный ремонт из программного комплекса «кАпилка» в систему АИС ЖКХ -33 (сентябрь-октябрь 2015 года).



5.1. Сведения о специальных счетах, владельцем которых определен региональный оператор

По состоянию на 01.01.2015 года некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» является владельцем 1575 специальных счетов, открытых в соответствии с общими решениями собственников многоквартирных домов, в том числе:

- в филиале Банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеже – 1494 счета;
- в ПАО «Сбербанк России» - 39 счетов;
- в ПАО «МИНБанк» - 41 счет;
- в ПАО «Промсвязьбанк» - 1 счет.

В течение 2015 года в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об изменении способа формирования фонда капитального ремонта со специального счета, владельцем которого является региональный оператор на счет регионального оператора или об изменении владельца специального счета с регионального оператора на ТСЖ, ЖСК или управляющую компанию, региональным оператором было закрыто 158 специальных счетов, в том числе:

- в филиале Банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеже – 128 счетов;
- в ПАО «Сбербанк России» - 8 счетов;
- в ПАО «МИНБанк» - 22 счета.

В течение 2015 года в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об изменении владельца специального счета с ТСЖ, ЖСК или управляющей компании на регионального оператора было открыто 11 специальных счетов, в том числе:

- в филиале Банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеже – 10 счетов;
- в ПАО «Сбербанк России» - 1 счет.



По состоянию на 31.12.2015 года Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» является владельцем 1428 специальных счетов, в том числе:

- в филиале Банка ВТБ (ПАО) в городе Воронеже – 1376 счетов;
- в ПАО «Сбербанк России» - 32 счета;
- в ПАО «МИНБанк» - 19 счетов;
- в ПАО «Промсвязьбанк» - 1 счет.



5.2. Основные показатели работы расчетно-финансового отдела в 2015 году

Данные по количеству обслуживаемых лицевых счетов	
Общее количество обслуживаемых лицевых счетов, в т.ч.	420 051
- физические лица	381 145
- муниципальные образования	33 506
- юридические лица	5 400
Данные по начисленным и оплаченным взносам	
Начислено взносов на капитальный ремонт по счету регионального оператора, тыс. руб., в т.ч.	1 113 191,12
- физические лица	1 017 005,54
- муниципальные образования	89 619,65
- юридические лица	6 565,93
Оплачено взносов на капитальный ремонт по счету регионального оператора, тыс. руб., в т.ч.	909 673,50
- физические лица	822 259,06
- муниципальные образования	80 846,32
- юридические лица	6 568,12
Уровень собираемости взносов по счету регионального оператора на 01.01.2015 года, %	58,45
Уровень собираемости взносов по счету регионального оператора на 31.12.2015 года, %	81,57
Начислено взносов на капитальный ремонт по специальным счетам регионального оператора, тыс. руб., в т.ч.	396 491,61
- физические лица	374 568,60
- муниципальные образования	18 564,11
- юридические лица	3 358,90
Оплачено взносов на капитальный ремонт по специальным счетам регионального оператора, тыс. руб., в т.ч.	371 410,61
- физические лица	351 017,39
- муниципальные образования	17 338,42
- юридические лица	3 054,80
Уровень собираемости взносов по счету регионального оператора на 01.01.2015 года, %	67,73
Уровень собираемости взносов по счету регионального оператора на 31.12.2015 года, %	94,34
Поступило денежных средств на счет регионального оператора, тыс. руб.	1 025 202,93
Списано денежных средств со счета регионального оператора, тыс. руб.	848 741,89
Поступило денежных средств на специальные счета регионального оператора, тыс. руб.	375 277,51
Списано денежных средств со специальных счетов регионального оператора, тыс. руб.	22 473,65



5.3. Сведения о размещении временно свободных денежных средств

По состоянию на 31.12.2015 года за 2015 год от собственников помещений в многоквартирных домах поступило 1 418 591 696,37 рублей в виде оплаты взносов на капитальный ремонт из начисленных за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 взносов на капитальный ремонт на сумму 1 509 682 729, 16 рублей.

При этом на счет регионального оператора поступило 954 255 457,26 рублей, на специальные счета, владельцем которых является региональный оператор 464 336 239,11 рублей.

Свободные денежные средства на счете регионального оператора в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 21.10.2014 к Договору банковского счета Р810-09-020144 от 28.03.2014 размещались на условиях неснижаемого остатка, сумма полученных процентов от данного размещения составила 50 855 780,82 рублей (подробная информация в таблице ниже).

Средства будут использованы в порядке использования доходов, полученных от размещения временно свободных денежных средств, находящихся на счете регионального оператора, утвержденного постановлением администрации Владимирской области от 02.11.2015 № 1087 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 01.04.2014 № 303 «О порядке разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2016 году.



Таблица:

Размещение временно свободных денежных средств, находящихся на счете регионального оператора				
Сумма размещения (тыс. рублей)	Период размещения		Размер процентной ставки	Полученный от размещения доход
2015 год				
220 000 000,00	21.10.2014	20.01.2015	6,00	3 290 958,90
80 000 000,00	25.12.2014	15.01.2015	21,00	966 575,34
380 000 000,00	05.02.2015	26.02.2015	13,50	2 951 506,85
30 000 000,00	16.02.2015	18.04.2015	12,00	601 643,84
380 000 000,00	26.02.2015	28.04.2015	12,14	7 709 731,51
30 000 000,00	17.03.2015	17.05.2015	11,50	576 575,34
30 000 000,00	26.03.2015	26.05.2015	11,10	556 520,55
30 000 000,00	13.04.2015	13.05.2015	10,20	251 506,85
52 000 000,00	20.04.2015	21.05.2015	10,65	470 350,68
380 000 000,00	28.04.2015	29.05.2015	9,50	3 066 027,40
70 000 000,00	13.05.2015	23.06.2015	8,35	656 561,64
40 000 000,00	19.05.2015	20.07.2015	8,35	567 342,47
60 000 000,00	21.05.2015	21.07.2015	8,35	837 287,67
60 000 000,00	26.05.2015	27.07.2015	8,20	835 726,03
380 000 000,00	29.05.2015	28.08.2015	8,70	8 242 356,16
30 000 000,00	09.06.2015	20.07.2015	8,50	286 438,36
70 000 000,00	23.06.2015	21.08.2015	8,20	927 835,62
20 000 000,00	06.07.2015	04.09.2015	7,70	253 150,68
80 000 000,00	20.07.2015	18.09.2015	8,15	1 071 780,82
75 000 000,00	21.07.2015	11.08.2015	8,20	353 835,62
150 000 000,00	18.08.2015	11.11.2015	7,86	2 745 616,44
420 000 000,00	28.08.2015	28.10.2015	7,86	5 517 073,97
30 000 000,00	04.09.2015	04.11.2015	7,78	390 065,75
30 000 000,00	02.10.2015	02.11.2015	7,78	198 230,14
420 000 000,00	28.10.2015	27.11.2015	7,78	2 685 698,63
60 000 000,00	05.11.2015	07.12.2015	7,95	418 191,78
150 000 000,00	11.11.2015	14.12.2015	7,95	1 078 150,68
400 000 000,00	27.11.2015	14.12.2015	8,00	1 490 410,96
60 000 000,00	08.12.2015	21.12.2015	8,00	170 958,90
550 000 000,00	14.12.2015	21.12.2015	8,00	843 835,62
550 000 000,00	21.12.2015	28.12.2015	8,00	843 835,62
Итого				50 55 780,82



5.4. Расходование ежегодного имущественного взноса, полученного от учредителя Фонда

Учредителем Фонда (Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области) в первом полугодии 2015 года в адрес Фонда были перечислена субсидия в размере 27 532,8 тысяч рублей в виде ежегодного имущественного взноса учредителя.

Данные расходы предусмотрены ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2015 год, утвержденной Законом Владимирской области от 29.12.2014 № 188-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», и подлежат расходованию на цели, указанные в постановлении Губернатора Владимирской области от 15.11.2003 № 1283 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» в виде имущественных взносов учредителя».

За 2015 год на административно хозяйственную деятельность Фонда было потрачено 36 594,7 тысяч рублей, из которых на:

- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов – 1 946,5 тысяч рублей;
- приобретение и установку программного обеспечения – 44,4 тысяч рублей;
- оплату труда сотрудников и начисления на выплаты по оплате труда – 16 574,0 тысяч рублей;
- уплату налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации – 4 612,1 тысяч рублей;
- оплату работ, услуг по содержанию имущества – 2 041,3 тысяч рублей;



- оплату расходов на выставление платежных документов собственникам помещений в многоквартирных домах в целях уплаты взносов на капитальный ремонт – 10 132,0 тысяч рублей;
- оплату услуг связи, в том числе почтовой – 651,1 тысяч рублей;
- оплату государственной пошлины и выписок о зарегистрированных правах собственности на помещения в многоквартирных домах в целях взыскания задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт – 122,1 тысяч рублей;
- оплату расходов по аренде помещений – 163,7 тысяч рублей;
- прочие расходы – 307,5 тысяч рублей.

Кроме того, за счет размещения средств, перечисленных в Фонд из бюджета Владимирской области в виде имущественного взноса, в 2015 году дополнительно получено 8 122,5 тысяч рублей, данные средства использованы на обеспечение административно-хозяйственной деятельности Фонда в 2015 году, что уменьшило нагрузку на областной бюджет.

Остаток неиспользованных денежных средств на 1 января 2016 года составил 2 462,9 тысяч рублей.



6. Информирование населения области о функционировании региональной системы капитального ремонта

В 2015 году Фондом велась активная информационно- разъяснительная работа среди собственников помещений в многоквартирных домах. Основной целью информационной работы было осуществление максимально возможного информирования жителей непосредственно о сути программы капитального ремонта и о ходе реализации программы на территории Владимирской области.

Основными задачами информационной работы Фонда в 2015 году были:

- наполнение информационного поля через различные каналы;
- формирование лояльности к программе через акцентирование внимания собственников на положительных примерах капремонта на территории региона.

Для достижения поставленных задач были задействованы следующие информационные каналы:

- областные и региональные теле-радиоканалы;
- печатные СМИ региона;
- официальный сайт Фонда капремонта Владимирской области;
- информационные дни и пресс-туры для СМИ региона;
- встречи с жителями.

В тех городах Владимирской области, где есть региональные (кабельные) телеканалы вещания, были проведены прямые эфиры с участием руководства Фонда капитального ремонта Владимирской области.





Жители городов Александрова, Струнино, Карабаново («АлексТелеИнформ»), Коврова («Наш регион-33»), Киржача («Информ Сервис»), Гусь-Хрустального (кабельное телевидение «Центральный регион»), Красная Горбатка смогли в прямом эфире задать интересующие их вопросы и получить квалифицированные ответы. Всего за первое полугодие 2015 года состоялось 7 подобных программ по вопросам реализации программы капитального ремонта.

Кроме того, в городе Владимире подобные программы в прямом эфире с участием представителей руководства Фонда капремонта прошли на телеканале «ВАРИАНТ» - 3 программы.



На областном телеканале Губерния33 вышло 3 выпуска программы «На всю Владимирскую...» по вопросам реализации программы капремонта на территории области. В них принимали участие представители руководства Фонда, вопросы были подготовлены на основе вопросов жителей, полученных в ходе предварительного анонса программ.





Также, в 2015 году с участием представителей руководства Фонда капремонта Владимирской области состоялись прямые эфиры на следующих радиостанциях:

- РАДИО РОССИИ – 5 эфиров;
- Радио Комсомольская Правда-Владимир- 1 эфир;
- Авторadio- Владимир – 1 эфир;

За время эфиров свои вопросы в прямом эфире смогли задать более 50 жителей области. Общая продолжительность радио-эфиров- 6.5 часов.

Все эфиры были проведены на бесплатной основе.



Для информирования и формирования лояльности у жителей к программе капитального ремонта на территории Владимирской области также активно применялись формы личного взаимодействия с собственниками МКД, старшими по домам, активистами в муниципальных образованиях области. В каждой из встреч принимали участие представители руководства Фонда капремонта: генеральный директор или его первый заместитель.





Кроме этого, руководство и специалисты Фонда активно принимали участие в реализации проекта «Школа грамотного потребителя», проводя уроки для жителей по вопросам организации и проведения капитального ремонта.



Для информирования жителей области о ходе реализации программы капремонта в течение 2015 года было проведено 5 информационных дней для СМИ региона, в ходе которых были организованы пресс-конференции руководителя Фонда капремонта, а также были организованы выезды на дома, как уже отремонтированные по программе капитального ремонта, так и находящиеся в стадии ремонта.



На каждом объекте для журналистов были организованы встречи с жителями домов, представителями общественных организаций, подрядных организаций, стройконтроля, государственной жилищной инспекции.

Все приглашенные СМИ по итогам информационных дней выпустили информационные сюжеты и статьи - всего за 2015 г. более 40.

На областном телеканале «Губерния33» в 2015 году был запущен спецпроект «Я-собственник», в котором в отдельной рубрике постоянно освещались вопросы капремонта: как выбрать способ формирования фонда капремонта, как и где узнать о планируемом капремонте своего дома, как проверить платежную дисциплину своих соседей и многие другие.

Вся информация о ходе реализации программы капитального ремонта на территории Владимирской области регулярно и оперативно размещается на официальном сайте регионального оператора сети «Интернет» по адресу: www.fondkr33.ru. Также, в 2015 году продолжалась работа с интернет-ресурсами «мкд33.рф» и «подрядчик33.рф».

По итогам мониторинга Некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» информационной открытости сайтов региональных операторов фондов капитального ремонта сайт НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» находился на 3-м месте среди 82 субъектов Российской Федерации (в 1 квартале 2015 года).

За 2015 год в печатных СМИ региона было размещено более 60 публикаций на тему реализации программы капитального ремонта на территории Владимирской области.

Итогом проведенной за 2015 год в рамках программы информирования жителей о ходе реализации программы капитального ремонта на территории Владимирской области работы стало осуществление более 150 информационных взаимодействий всех уровней с учетом задействования



теле-, радио каналов, печатных и электронных СМИ, личных встреч с жителями.

Был утвержден график приема граждан руководящим составом Фонда в 2015 году. Всего за 2015 год на таких приемах побывало более 200 человек, каждый из которых получил квалифицированный ответ на свое обращение.

Обратная связь с населением осуществлялась как через сайт Фонда fondkr33.ru, так и посредством подготовки ответов на письменные обращения, консультаций по телефону и электронной почте. В 2015 году было направлено 1255 ответов на письменные обращения граждан.

В 2015 году в Фонде была запущена в работу бесплатная многоканальная телефонная линия с номером **8-800-200-11-85**. В течение года на нее было принято более 20 000 звонков.

К концу 2015 года уменьшилось количество обращений жителей к специалистам фонда, а также изменилось содержание вопросов: если в начале 2015 года жители спрашивали что вообще такое капремонт, кто создал Фонд, как рассчитывался размер взноса, то к концу 2015 года собственников стало интересовать, как можно повлиять на очередность капремонта, как сменить способ формирования фонда капремонта своего дома, как разделить лицевые счета собственников, т.е., содержание вопросов сменилось от общего к частному, что свидетельствует об увеличении информированности жителей.



Перечень сданных в 2015 году объектов по краткосрочному плану 2014 года

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
1	Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 3	Крыша
2	Александров г, Вокзальная ул, 20	Крыша
3	Александров г, Институтская ул, 14	Крыша
4	Александров г, Коссович ул, 4	Крыша
5	Александров г, Ленина ул, 20	Водоотведение, ГВС, ХВС, отопление
6	Александров г, Ленина ул, 26	Водоотведение, ГВС, ХВС, отопление
7	Александров г, Ленина ул, 7	Крыша
8	Александров г, Маяковского ул, 1	Крыша
9	Александров г, Маяковского ул, 48 корп. 2	Крыша
10	Александров г, Ново-Стрелецкий проезд, 20	Крыша
11	Александров г, Сосновский пер, 19	ГВС, ХВС, отопление
12	Александров г, Стрелецкая наб, 7	Крыша
13	Александров г, Стрелецкая наб, 8	Крыша
14	Александров г, Терешковой ул, 13 корп. 2	Крыша
15	Александров г, Терешковой ул, 7 корп. 3	Крыша
16	Александров г, Терешковой ул, 8	Крыша
17	Александров г, Фабрика Калинина ул, 26	Водоотведение, ГВС, ХВС, отопление, фасад
18	Александров г, Юбилейная ул, 4	ГВС
19	Александровский р-н, Карабаново г, Карпова ул, 1	Крыша
20	Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 2	Крыша
21	Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 9	Крыша
22	Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 32	Крыша
23	Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 2	Водоотведение, отопление, крыша
24	Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 3	Отопление, электрика, крыша, фасад
25	Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 4	Отопление, крыша
26	Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 8	ХВС, Водоотведение, отопление, ОДПУ, крыша
27	Александровский р-н, Маяк п, Дорожная ул, 11	Крыша
28	Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 4	Крыша
29	Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 1	ХВС
30	Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 2	ХВС
31	Александровский р-н, Бакшеево с, Совхозная ул, 5	Крыша
32	Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 6	Крыша
33	Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 7	Крыша
34	Вязники г, Благовещенская ул, 37а	Крыша
35	Вязники г, Дечинский мкр, 10	ГВС, ОДПУ, электрика, фасад
36	Вязники г, Мельничный проезд, 4	Крыша
37	Вязники г, Металлистов ул, 4	Крыша
38	Вязники г, Нововязники мкр, Привокзальная ул, 46	Водоотведение, ХВС
39	Вязники г, Нововязники мкр, Южная ул, 11	Отопление, ОДПУ, электрика
40	Вязники г, Октябрьская ул, 5	Крыша
41	Вязники г, Физкультурная ул, 18	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
42	Вязники г, Физкультурная ул, 8	Крыша
43	Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 1	Крыша
44	Вязниковский р-н, Лукново п, Возрождения ул, 6	Крыша
45	Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 25	Крыша
46	Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 7	Водоотведение, ОДПУ, крыша
47	Вязниковский р-н, Серково (Большевысоковский с/с) д, Заречная 2-я ул, 3	Крыша
48	Вязниковский р-н, Паустово д, Текстильщиков ул, 6	Крыша
49	Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 3	Крыша
50	Вязниковский р-н, Центральный п, Клубная ул, 3	Фасад
51	Вязниковский р-н, Буторлино д, Нагорная ул, 1	Крыша
52	Владимир г, 9 Января ул, 4а	Фасад
53	Владимир г, Алябьева ул, 13а	Крыша
54	Владимир г, Алябьева ул, 16	Крыша
55	Владимир г, Асаткина ул, 24	Крыша
56	Владимир г, Асаткина ул, 34	Крыша
57	Владимир г, Безыменского ул, 2	Лифт
58	Владимир г, Большая Московская ул, 37	Крыша
59	Владимир г, Большая Нижегородская ул, 104	Крыша
60	Владимир г, Большие Ременники ул, 2а	Крыша, фасад
61	Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 5	Крыша
62	Владимир г, Гагарина ул, 10	Крыша, фасад
63	Владимир г, Гагарина ул, 12	Водоотведение, фасад
64	Владимир г, Диктора Левитана ул, 3	Крыша
65	Владимир г, Диктора Левитана ул, 3В	Лифт
66	Владимир г, Ерофеевский спуск, 3	ХВС, водоотведение, отопление, фасад, крыша
67	Владимир г, Завадского ул, 7А	Крыша
68	Владимир г, Комиссарова ул, 1	Лифт
69	Владимир г, Красноармейская ул, 42	Крыша
70	Владимир г, Мира ул, 70	Крыша
71	Владимир г, Мира ул, 72	Крыша
72	Владимир г, Никитская ул, 23	Крыша
73	Владимир г, Николо-Галейская ул, 1	Крыша
74	Владимир г, Ново-Ямская ул, 2	Крыша
75	Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 11	Крыша
76	Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 12	Крыша
77	Владимир г, Полины Осипенко ул, 4	Крыша
78	Владимир г, Рабочий спуск, 3/29	Крыша
79	Владимир г, Растопчина ул, 59	Крыша
80	Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6	Лифт
81	Владимир г, Стасова ул, 36А	Крыша
82	Владимир г, Стрелецкий городок, 49	Крыша, фасад
83	Владимир г, Стрелецкий городок, 60	Крыша
84	Владимир г, Строителей пр-кт, 38	Крыша
85	Владимир г, Энергетик мкр, Садовая ул, 13	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
86	Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 27А	Крыша
87	Владимир г, Юбилейная ул, 18А	Фасад
88	Владимир г, Юбилейная ул, 30	Крыша
89	Владимир г, Юбилейная ул, 32	Крыша
90	Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 30	Крыша
91	Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, 33	Крыша
92	Гусь-Хрустальный г, Добролюбова ул, 8	Крыша
93	Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 2	Крыша, фасад
94	Гусь-Хрустальный г, Иркутская ул, 26а	Водоотведение
95	Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 58	Крыша, фасад
96	Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 3	Крыша
97	Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 2	Крыша
98	Гусь-Хрустальный г, Коммунистическая ул, 4	Отопление
99	Гусь-Хрустальный г, Красных Партизан ул, 72/29	Крыша
100	Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 24а	ХВС, Крыша
101	Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 30	Крыша
102	Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 4а	Крыша
103	Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 74	Отопление, крыша
104	Гусь-Хрустальный г, Перегрузочная ул, 5а	Крыша
105	Гусь-Хрустальный г, Полевая ул, 3	Отопление
106	Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 2а	Электрика, крыша
107	Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 67	Крыша
108	Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 39	Крыша
109	Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 4	ГВС, ХВС, крыша
110	Ковров г, 19 Партсъезда ул, 7	Отопление
111	Ковров г, Абельмана ул, 38	Крыша
112	Ковров г, Абельмана ул, 82	Крыша
113	Ковров г, Бабушкина ул, 14	Крыша
114	Ковров г, Белинского ул, 1 корп. 2	Крыша
115	Ковров г, Белинского ул, 6	Крыша
116	Ковров г, Брюсова ул, 23	Крыша
117	Ковров г, Брюсова ул, 25	Крыша
118	Ковров г, Брюсова ул, 27	Крыша
119	Ковров г, Брюсова ул, 56	Отопление, электрика
120	Ковров г, Брюсова ул, 58	Отопление, электрика
121	Ковров г, Ватутина ул, 26	Крыша
122	Ковров г, Владимирская ул, 1	Крыша
123	Ковров г, Волго-Донская ул, 18	Крыша
124	Ковров г, Волго-Донская ул, 24	ГВС, электрика
125	Ковров г, Волго-Донская ул, 8 корп. 2	Отопление
126	Ковров г, Гастелло ул, 5	Крыша
127	Ковров г, Грибоедова ул, 50	Крыша
128	Ковров г, Грибоедова ул, 72	Крыша
129	Ковров г, Димитрова ул, 4	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
130	Ковров г, Еловая ул, 84	Крыша
131	Ковров г, Космонавтов ул, 6/3	ГВС
132	Ковров г, Куйбышева ул, 10	Электрика
133	Ковров г, Ленина пр-кт, 11	Крыша
134	Ковров г, Ленина пр-кт, 13	Крыша
135	Ковров г, Ленина пр-кт, 20	ХВС, отопление, электрика
136	Ковров г, Ленина пр-кт, 21	ОДПУ, ХВС
137	Ковров г, Ленина пр-кт, 25	Отопление, ОДПУ, электрика
138	Ковров г, Ленина пр-кт, 29	Электрика
139	Ковров г, Ленина пр-кт, 31	отопление, электрика
140	Ковров г, Ленина пр-кт, 38А	Крыша
141	Ковров г, Ленина пр-кт, 40	Крыша
142	Ковров г, Ленина пр-кт, 42	Отопление
143	Ковров г, Ленина пр-кт, 44	Крыша
144	Ковров г, Ленина пр-кт, 63	Отопление
145	Ковров г, Ленина пр-кт, 7	Крыша
146	Ковров г, Ленина пр-кт, 9	Электрика
147	Ковров г, Лесная ул, 3	ХВС
148	Ковров г, Лесная ул, 5	ХВС
149	Ковров г, Лесная ул, 9	ХВС
150	Ковров г, Летняя ул, 41	Крыша
151	Ковров г, Летняя ул, 82	Отопление
152	Ковров г, Либерецкая ул, 1	Отопление
153	Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 34	Фасад
154	Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 36	Крыша
155	Ковров г, Лопатина ул, 61	Крыша
156	Ковров г, Ногина ул, 59	Отопление
157	Ковров г, Олега Кошевого ул, 10	Крыша
158	Ковров г, Островского ул, 57/2	Крыша
159	Ковров г, Пролетарская ул, 38	Крыша
160	Ковров г, Свердлова ул, 11	Крыша
161	Ковров г, Советская ул, 2а	Отопление
162	Ковров г, Социалистическая ул, 27	Отопление
163	Ковров г, Транспортная ул, 79	Крыша
164	Ковров г, Туманова ул, 10	Крыша
165	Ковров г, Федорова ул, 93	Крыша
166	Ковров г, Фрунзе ул, 10	Электрика
167	Ковров г, Циолковского ул, 35	Отопление
168	Ковров г, Чернышевского ул, 2	Крыша
169	Ковров г, Чернышевского ул, 4	Крыша
170	Гороховец г, Кирова ул, 4	Крыша
171	Гороховец г, Ленина ул, 32	Крыша
172	Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Новофабричная ул, 23	Фундамент
173	Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 4	Фундамент

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
174	Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 4	Крыша
175	Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 5	Крыша
176	Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Чкалова ул, 18	Крыша
177	Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Южная ул, 2	Крыша
178	Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 1	Крыша
179	Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 12	Фасад
180	Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6а	Крыша
181	Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 21	Крыша
182	Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 7	Крыша
183	Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Центральная ул, 5	Крыша
184	Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Мира ул, 10	Крыша
185	Радужный г, 1-й кв-л, 1	Крыша
186	Радужный г, 1-й кв-л, 10	Крыша
187	Радужный г, 1-й кв-л, 11	Крыша
188	Радужный г, 1-й кв-л, 17	Фасад
189	Радужный г, 1-й кв-л, 19	Фасад
190	Радужный г, 1-й кв-л, 2	Крыша
191	Радужный г, 1-й кв-л, 28	Крыша
192	Радужный г, 1-й кв-л, 30	ХВС
193	Радужный г, 1-й кв-л, 32	ГВС, отопление, крыша
194	Радужный г, 1-й кв-л, 8	Крыша
195	Радужный г, 3-й кв-л, 11	Крыша
196	Радужный г, 3-й кв-л, 12	Отопление
197	Радужный г, 3-й кв-л, 13	Крыша
198	Радужный г, 3-й кв-л, 17А	Крыша
199	Радужный г, 3-й кв-л, 19	Крыша
200	Радужный г, 3-й кв-л, 2	Крыша
201	Радужный г, 3-й кв-л, 21	Крыша
202	Радужный г, 3-й кв-л, 3	ГВС, ХВС, крыша
203	Радужный г, 3-й кв-л, 5	ГВС, крыша
204	Радужный г, 3-й кв-л, 6	ГВС, ХВС, крыша
205	Камешково г, Володарского ул, 4	Крыша, подвал
206	Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Карла Маркса ул, 2	Крыша
207	Камешковский р-н, Новки п, Калинина ул, 2	Фундамент
208	Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 4	Крыша
209	Камешковский р-н, Второво с, Железнодорожная ул, 11	Крыша
210	Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 6	Водоотведение, крыша
211	Камешковский р-н, Второво с, Сосновая ул, 2	Водоотведение, крыша
212	Камешковский р-н, Лаптево с, Луговая ул, 2	Водоотведение, электрика, крыша
213	Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 84	Электрика, крыша, фундамент
214	Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 85	Крыша
215	Камешковский р-н, Новая Быковка д, 65	Водоотведение, электрика, крыша, фундамент
216	Камешковский р-н, Новая Печуга д, 62	Крыша
217	Киржач г, Гайдара ул, 35	Крыша
218	Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 26	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
219	Киржач г, Красный Октябрь мкр, Свердлова ул, 7	Крыша
220	Киржач г, Магистральная ул, 3	Крыша
221	Киржач г, Некрасовская ул, 18	Крыша
222	Киржач г, Прибрежный кв-л, 7а	Крыша
223	Киржач г, Пугачева ул, 14	Крыша
224	Киржач г, Чайкиной ул, 6	Крыша
225	Киржач г, Чехова ул, 4	Крыша
226	Киржачский р-н, Новоселово д, Гагарина ул, 3	Крыша
227	Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 5	Крыша
228	Киржачский р-н, Кашино д, 27	Крыша
229	Ковровский р-н, Мелехово п, Пионерская ул, 5	Крыша
230	Ковровский р-н, Иваново с, Коммунистическая ул, 22	Крыша
231	Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Садовая ул, 6	Электрика, фасад
232	Ковровский р-н, Санатория им Абельмана п, 1	Крыша
233	Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 64	Крыша
234	Ковровский р-н, Малыгино п, Юбилейная ул, 65	Крыша
235	Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 1	Отопление, крыша
236	Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 4	Электрика, крыша
237	Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 15	Крыша
238	Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 24	Крыша
239	Кольчугино г, Коллективная ул, 47	Крыша
240	Кольчугино г, Ленина ул, 19	Крыша
241	Кольчугино г, Мира ул, 6	Крыша
242	Кольчугино г, Московская ул, 66	Крыша
243	Кольчугино г, Шмелева ул, 1	Крыша
244	Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничная ул, 11	Крыша
245	Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничный пер, 2	Крыша
246	Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 2	Крыша
247	Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесной пер, 1	Крыша
248	Кольчугинский р-н, Бавлены п, Центральная ул, 10	Отопление, ХВС
249	Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьная ул, 4	Крыша
250	Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 4	Крыша
251	Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 8	Крыша
252	Меленки г, 60 лет Октября ул, 27	Крыша
253	Меленки г, Дзержинского ул, 60	Крыша
254	Меленки г, Коньшева ул, 3А	Крыша
255	Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 2	Крыша
256	Муром г, Автодора ул, 40	Крыша
257	Муром г, Владимирская ул, 7	Крыша
258	Муром г, Карачаровское ш, 30А	Крыша
259	Муром г, Кирова ул, 12	Крыша
260	Муром г, Кирова ул, 16	Фасад
261	Муром г, Комсомольская ул, 7	Крыша
262	Муром г, Комсомольская ул, 70	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
263	Муром г, Красногвардейская ул, 50	Крыша
264	Муром г, Лаврентьева ул, 11	Крыша
265	Муром г, Ленинградская ул, 34/5	Крыша
266	Муром г, Льва Толстого ул, 74	Крыша
267	Муром г, Меленковская ул, 5	Крыша
268	Муром г, Мичуринская ул, 3	Крыша
269	Муром г, Московская ул, 45	Отопление
270	Муром г, Московская ул, 68	Крыша
271	Муром г, Муромская ул, 1	Крыша
272	Муром г, Октябрьская ул, 69	Крыша
273	Муром г, Октябрьская ул, 73	Крыша
274	Муром г, Орловская ул, 25	Крыша
275	Муром г, Орловская ул, 25а	ГВС
276	Муром г, Первомайская ул, 13	Крыша
277	Муром г, Пролетарская ул, 73	Крыша
278	Муром г, Радиозаводское ш, 20	Крыша
279	Муром г, Филатова ул, 6А	Крыша
280	Муром г, Экземплярского ул, 53	Крыша
281	Муром г, Южная ул, 22	Крыша
282	Муром г, Южная ул, 6	Крыша
283	Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 12	Крыша
284	Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 2	ХВС
285	Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 6	Крыша
286	Петушинский р-н, Костерево г, Матросова ул, 7	Крыша
287	Петушинский р-н, Костерево г, Рабочая ул, 2	Крыша
288	Петушинский р-н, Костерево г, Чехова ул, 4	ХВС, электрика
289	Петушинский р-н, Костерево г, Школьная ул, 10	Крыша
290	Петушки г, Московская ул, 12	Крыша
291	Петушки г, Московская ул, 2	Фасад
292	Петушки г, Московская ул, 26	Фасад
293	Петушки г, Московская ул, 34	Фасад
294	Петушки г, Московская ул, 8	ГВС
295	Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 53	Электрика
296	Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 19	Электрика, фасад
297	Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 19	ГВС, ХВС
298	Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 26	ГВС, ХВС
299	Петушинский р-н, Покров г, К.Либкнехта ул, 4	ГВС, ХВС
300	Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 14	Крыша
301	Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 12	Крыша
302	Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Заводская 3-я ул, 2	Крыша
303	Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 79	Крыша
304	Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 24	Крыша
305	Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 10	Крыша
306	Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/2	Отопление

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
307	Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3	Отопление
308	Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 49б	Крыша, фасад
309	Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 93	Водоотведение, ХВС, крыша
310	Собинский р-н, Лакинск г, Пушкина ул, 11	Крыша
311	Собинка г, Лакина ул, 1Б	Крыша
312	Собинка г, Центральная ул, 25	Крыша
313	Собинка г, Чайковского ул, 8	Крыша
314	Собинка г, Шибаева ул, 1	Крыша
315	Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 16	Крыша
316	Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 5	Крыша
317	Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 1	Крыша
318	Собинский р-н, Бабаево с, сан Тонус тер, 2	Крыша
319	Собинский р-н, Колокша п, Железнодорожная ул, 1А	Крыша
320	Собинский р-н, Рождествено с, Дружбы ул, 3	Крыша
321	Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 4	Крыша
322	Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 1	Электрика
323	Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2	Фасад
324	Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 4	Фасад
325	Судогда г, Гагарина ул, 11	Фасад
326	Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 5	Крыша
327	Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 9	Крыша
328	Судогодский р-н, Головино п, Советская ул, 19А	Крыша
329	Судогодский р-н, Лаврово д, Новая ул, 2	Электрика
330	Судогодский р-н, Лаврово д, Новая ул, 3	Электрика
331	Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 15	Крыша
332	Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 9	Крыша
333	Суздаль г, Гоголя ул, 37	Водоотведение, ГВС, ХВС, электрика, крыша
334	Суздаль г, Лоунская ул, 1	Крыша
335	Суздаль г, Лоунская ул, 9	Крыша
336	Суздальский р-н, Садовый п, Строителей ул, 1	Крыша
337	Суздальский р-н, Новый п, Новая ул, 13	Электрика
338	Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 70	Электрика
339	Юрьев-Польский г, Герцена ул, 11	Электрика
340	Юрьев-Польский г, Герцена ул, 13	ХВС
341	Юрьев-Польский г, Герцена ул, 5	Электрика
342	Юрьев-Польский г, Герцена ул, 7	Электрика
343	Юрьев-Польский г, Горького ул, 20	Электрика
344	Юрьев-Польский г, Луговая ул, 37	Электрика
345	Юрьев-Польский г, Луговая ул, 7	Электрика
346	Юрьев-Польский г, Набережная ул, 4А	Крыша
347	Юрьев-Польский г, Перфильева ул, 34А	Электрика
348	Юрьев-Польский г, Революции ул, 9	ГВС, ХВС
349	Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 109	Крыша
350	Юрьев-Польский р-н, Косинское с, Школьная ул, 3	Водоотведение

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
351	Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 5	Крыша
352	Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 9	Крыша
353	Юрьев-Польский р-н, Энтузиаст с, Центральная ул, 1А	Фасад
354	Юрьев-Польский р-н, Федоровское (Небыловское МО) с, 70	Крыша
355	Юрьев-Польский р-н, Федоровское (Небыловское МО) с, 76	ХВС
356	Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 10	Крыша
357	Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 5	Крыша
358	Юрьев-Польский р-н, Сима с, Багратиона ул, 36	Подвал
359	Юрьев-Польский р-н, Сима с, Гражданская ул, 9	Крыша
360	Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 1	Водоотведение
361	Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 4	Электрика

Перечень сданных в 2015 году объектов по краткосрочному плану 2015 года

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
1	Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 5	Крыша
2	Александров г, 1-я Крестьянская ул, 18	Крыша
3	Александров г, Ануфриева ул, 10	Крыша
4	Александров г, Комсомольский поселок ул, 36	Крыша
5	Александров г, Комсомольский поселок ул, 38	Крыша
6	Александров г, Королева ул, 3	Лифт
7	Александров г, Красный пер, 2	Лифт
8	Александров г, Маяковского ул, 22	Крыша
9	Александров г, Октябрьская ул, 10	Крыша
10	Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 4	Лифт
11	Александров г, Терешковой ул, 8 корп. 1	Водоотведение, отопление, ХВС
12	Александров г, Фабрика Калинина ул, 14	Крыша
13	Александровский р-н, Карабаново г, Гагарина ул, 4	Водоотведение
14	Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 3	ХВС, крыша
15	Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 4	ХВС, крыша
16	Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 5	Крыша
17	Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 6	ХВС, крыша
18	Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 7	ХВС, крыша
19	Александровский р-н, Карабаново г, Комсомольская ул, 8	ХВС, крыша
20	Александровский р-н, Карабаново г, Кооперативная ул, 25	Крыша
21	Александровский р-н, Карабаново г, Лермонтова пл, 2	Водоотведение, крыша
22	Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 1	Крыша
23	Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 3	Крыша
24	Александровский р-н, Карабаново г, Первомайская ул, 19	Водоотведение, ХВС, крыша
25	Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 3	Фасад
26	Александровский р-н, Карабаново г, Садовая ул, 7	Водоотведение, ХВС, крыша
27	Александровский р-н, Карабаново г, Садовый 1-й пер, 14	Водоотведение, ХВС, крыша
28	Александровский р-н, Карабаново г, Штыкова ул, 27	Водоотведение, ХВС
29	Александровский р-н, Струнино г, Больничный проезд, 11	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
30	Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 1	Водоотведение
31	Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 11	Крыша
32	Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 12	Крыша
33	Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 17	Крыша
34	Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 5	Крыша
35	Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 40	Крыша
36	Александровский р-н, Андреевское с, Советская А ул, 2	Крыша
37	Александровский р-н, Елькино д, Мира ул, 4	Крыша
38	Александровский р-н, Светлый п, Садовая ул, 2	Крыша
39	Александровский р-н, Лизуново д, Рябиновая ул, 3	Крыша
40	Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 3	Крыша, фасад
41	Александровский р-н, Бакшеево с, Совхозная ул, 2	Водоотведение, ХВС
42	Александровский р-н, Бакшеево с, Совхозная ул, 3	Фасад
43	Александровский р-н, Бакшеево с, Совхозная ул, 5	Фасад
44	Вязники г, Герцена ул, 38а	Крыша
45	Вязники г, Дечинский мкр, 14	Фасад
46	Вязники г, Железнодорожная ул, 44	Крыша
47	Вязники г, Железнодорожная ул, 51	Крыша
48	Вязники г, Металлистов ул, 23 корп. 1	Крыша
49	Вязники г, Металлистов ул, 23 корп. 2	Крыша
50	Вязники г, Новая ул, 12	Крыша
51	Вязники г, Новая ул, 2/2	Крыша
52	Вязники г, Нововязники мкр, Юбилейная ул, 6	Крыша, отопление
53	Вязники г, Октябрьская ул, 7	Крыша
54	Вязниковский р-н, Мстёра ст, Мира ул, 2	Крыша
55	Вязниковский р-н, Никологоры п, 1-я Пролетарская ул, 61	Крыша
56	Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 22а	Крыша
57	Вязниковский р-н, Большевысоково д, Садовая ул, 13	Крыша
58	Вязниковский р-н, Лукново п, Лермонтова ул, 21	Крыша
59	Вязниковский р-н, Октябрьский п, Первомайская ул, 2	Крыша
60	Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 1	Крыша
61	Вязниковский р-н, Серково (Большевысоковский с/с) д, Пролетарская ул, 5	Крыша
62	Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 1	Крыша
63	Вязниковский р-н, Паустово д, Центральная ул, 35	Отопление
64	Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 6	Крыша
65	Вязниковский р-н, Сарыево с, Школьная ул, 22	Крыша
66	Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 21	Крыша
67	Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 1	Крыша
68	Владимир г, 1-й Коллективный проезд, 6А	Крыша
69	Владимир г, 850-летия ул, 5	Крыша
70	Владимир г, 9 Января ул, 4а	Крыша
71	Владимир г, Алябьева ул, 12/26	Крыша
72	Владимир г, Алябьева ул, 18	Крыша
73	Владимир г, Асаткина ул, 22	Крыша
74	Владимир г, Асаткина ул, 30	Крыша
75	Владимир г, Балакирева ул, 31	Крыша
76	Владимир г, Балакирева ул, 37Д	Крыша
77	Владимир г, Белоконской ул, 15А	Крыша
78	Владимир г, Белоконской ул, 21	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
79	Владимир г, Благоднравова ул, 7	Лифт
80	Владимир г, Благоднравова ул, 9	Лифт
81	Владимир г, Большая Нижегородская ул, 73а	Отопление, ХВС
82	Владимир г, Большие Ременники ул, 17а	Крыша
83	Владимир г, Вокзальная ул, 15А	Крыша
84	Владимир г, Вокзальная ул, 16А	Крыша
85	Владимир г, Вокзальная ул, 9	Крыша
86	Владимир г, Горького ул, 102	Лифт
87	Владимир г, Горького ул, 105	Лифт
88	Владимир г, Горького ул, 82	Крыша
89	Владимир г, Диктора Левитана ул, 49	Крыша
90	Владимир г, Добросельская ул, 190	Фасад
91	Владимир г, Добросельская ул, 193	Крыша
92	Владимир г, Добросельская ул, 195	Крыша
93	Владимир г, Добросельская ул, 200	Крыша
94	Владимир г, Комиссарова ул, 14	Лифт
95	Владимир г, Крупской ул, 2	Крыша
96	Владимир г, Лакина ул, 129Б	Отопление
97	Владимир г, Лакина ул, 133А	Крыша
98	Владимир г, Лакина ул, 139	Лифт
99	Владимир г, Лакина ул, 151	Отопление
100	Владимир г, Лакина ул, 155	Крыша
101	Владимир г, Лакина ул, 173	Крыша
102	Владимир г, Лермонтова ул, 36	Крыша
103	Владимир г, Лермонтова ул, 40	Крыша
104	Владимир г, Луначарского ул, 24	Крыша
105	Владимир г, Михайловская ул, 8А	Лифт
106	Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 32	Лифт
107	Владимир г, Никитина ул, 2	Крыша
108	Владимир г, Никитина ул, 4	Крыша
109	Владимир г, Николо-Галейская ул, 21а	Крыша
110	Владимир г, Оргтруд мкр, Строителей ул, 2	Крыша
111	Владимир г, Пичугина ул, 13	Крыша
112	Владимир г, Рабочий спуск, 3/29	Фасад
113	Владимир г, Семашко ул, 16	Крыша
114	Владимир г, Строителей пр-кт, 18	Крыша
115	Владимир г, Строителей пр-кт, 2	Крыша
116	Владимир г, Строителей пр-кт, 28	Крыша
117	Владимир г, Строителей пр-кт, 28А	Крыша
118	Владимир г, Строителей пр-кт, 38Б	Крыша
119	Владимир г, Студенческая ул, 2	Крыша
120	Владимир г, Судогодское ш, 11	Крыша
121	Владимир г, Тракторная ул, 12	Крыша
122	Владимир г, Тракторная ул, 48	Крыша
123	Владимир г, Тракторная ул, 5А	Лифт
124	Владимир г, Тракторная ул, 9Б	Лифт
125	Владимир г, Труда ул, 17	Крыша
126	Владимир г, Труда ул, 3	Крыша
127	Владимир г, Урицкого ул, 30а	Крыша
128	Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 34А	Крыша
129	Владимир г, Юбилейная ул, 28	Крыша
130	Владимир г, Юбилейная ул, 60	Крыша
131	Владимир г, Юрьеvec мкр, Институтский городок, 21	Лифт
132	Владимир г, Юрьеvec мкр, Институтский городок, 24	Лифт
133	Владимир г, Юрьеvec мкр, Ноябрьская ул, 119	Крыша
134	Владимир г, Юрьеvec мкр, Ноябрьская ул, 5	Крыша
135	Владимир г, Юрьеvec мкр, Ноябрьская ул, 7	Крыша
136	Владимир г, Юрьеvec мкр, Ноябрьская ул, 9	Крыша
137	Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Влаcти пр-кт, 45	Водоотведение
138	Гусь-Хрустальный г, Владимирская ул, 1	Водоотведение

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
139	Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 11	Крыша
140	Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 12	Крыша, фасад
141	Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 30	Крыша
142	Гусь-Хрустальный г, Гусевский п, Октябрьская ул, 5	Крыша
143	Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 17	Крыша
144	Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 3	Крыша
145	Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 7	Крыша
146	Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 26	Крыша
147	Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 2	Крыша
148	Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 4	Крыша, электрика
149	Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 17	Крыша
150	Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 27	Электрика, крыша
151	Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 24	ГВС
152	Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 15	Отопление
153	Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 25	ГВС, ХВС
154	Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 14	Крыша
155	Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 16	Крыша
156	Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 19	Крыша
157	Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 33	Крыша
158	Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 37а	Крыша
159	Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 43	Крыша
160	Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 50	Крыша
161	Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 7	Крыша
162	Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 16	Крыша
163	Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 16А	Крыша
164	Гусь-Хрустальный г, Писарева ул, 20	Крыша
165	Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 4а	Крыша
166	Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 21а	Крыша
167	Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 11	Крыша
168	Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 28	Крыша
169	Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 32	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
170	Гусь-Хрустальный г, Торфяная ул, 4	Крыша, электрика
171	Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 15	Отопление, фасад
172	Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 15	Крыша, электрика
173	Ковров г, 3 Интернационала ул, 26	Водоотведение, отопление, электрика, крыша
174	Ковров г, 3 Интернационала ул, 32	Крыша
175	Ковров г, Абельмана ул, 105	Крыша
176	Ковров г, Абельмана ул, 13	Крыша
177	Ковров г, Абельмана ул, 135	Лифт
178	Ковров г, Абельмана ул, 21	Крыша
179	Ковров г, Абельмана ул, 23	Крыша
180	Ковров г, Абельмана ул, 42а	Крыша
181	Ковров г, Абельмана ул, 43	Крыша
182	Ковров г, Абельмана ул, 82	Водоотведение, ХВС
183	Ковров г, Абельмана ул, 88	Крыша
184	Ковров г, Барсукова ул, 27/8	Крыша
185	Ковров г, Белинского ул, 11	Крыша
186	Ковров г, Белинского ул, 11б	Отопление, ХВС
187	Ковров г, Белинского ул, 12	Крыша
188	Ковров г, Белинского ул, 3	Крыша
189	Ковров г, Грибоедова ул, 46	Крыша
190	Ковров г, Грибоедова ул, 58	Фасад
191	Ковров г, Грибоедова ул, 60	Крыша
192	Ковров г, Грибоедова ул, 72	Отопление, ХВС
193	Ковров г, Дегтярева ул, 121	Крыша
194	Ковров г, Дегтярева ул, 162	Лифт
195	Ковров г, Дегтярева ул, 204	Фасад
196	Ковров г, Еловая ул, 82/1	ХВС
197	Ковров г, Еловая ул, 84	ХВС
198	Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 17	Крыша
199	Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 19	Крыша
200	Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 19а	Крыша
201	Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 38	Крыша
202	Ковров г, Калинина ул, 1	Отопление, ХВС
203	Ковров г, Калинина ул, 14	Фасад
204	Ковров г, Калинина ул, 15	Крыша
205	Ковров г, Калинина ул, 22	Крыша
206	Ковров г, Киркижа ул, 14	Электрика
207	Ковров г, Краснознаменная ул, 10	Крыша
208	Ковров г, Краснознаменная ул, 7	Крыша
209	Ковров г, Краснознаменная ул, 8	Крыша
210	Ковров г, Ленина пр-кт, 26	Крыша
211	Ковров г, Ленина пр-кт, 28	Крыша
212	Ковров г, Ленина пр-кт, 33	Крыша, отопление
213	Ковров г, Ленина пр-кт, 50	Крыша
214	Ковров г, Ленина пр-кт, 58а	Крыша
215	Ковров г, Лепсе ул, 2	Крыша
216	Ковров г, Лепсе ул, 5	Крыша
217	Ковров г, Лесная ул, 11	ХВС, крыша
218	Ковров г, Лесная ул, 3	Крыша
219	Ковров г, Лесная ул, 9	Отопление
220	Ковров г, Летняя ул, 25	Крыша
221	Ковров г, Летняя ул, 27	Крыша
222	Ковров г, Летняя ул, 35	Крыша
223	Ковров г, Летняя ул, 51	Крыша
224	Ковров г, Летняя ул, 53	Крыша
225	Ковров г, Летняя ул, 55	Крыша
226	Ковров г, Летняя ул, 82	Фасад
227	Ковров г, Летняя ул, 88	Крыша
228	Ковров г, Либерецкая ул, 4	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
229	Ковров г, Либерецкая ул, 9	ХВС, фасад
230	Ковров г, Лопатина ул, 1	Крыша
231	Ковров г, Лопатина ул, 23	Крыша
232	Ковров г, Лопатина ул, 63	Крыша
233	Ковров г, Лопатина ул, 76	Крыша
234	Ковров г, Лопатина ул, 78	Водоотведение, отопление, ХВС, электрика
235	Ковров г, Машиностроителей ул, 3	Подвал
236	Ковров г, Моховая ул, 1	Крыша
237	Ковров г, Моховая ул, 10	Крыша
238	Ковров г, Моховая ул, 3	Крыша
239	Ковров г, Моховая ул, 8	Крыша
240	Ковров г, Моховая ул, 9	Отопление
241	Ковров г, Муромская ул, 1	Крыша
242	Ковров г, Муромский проезд, 6	Фасад
243	Ковров г, Муромский проезд, 7	Отопление, ХВС, крыша
244	Ковров г, Муромский проезд, 9	Отопление, крыша
245	Ковров г, Набережная ул, 17	Крыша
246	Ковров г, Набережная ул, 2	Крыша
247	Ковров г, Олега Кошевого ул, 1	Отопление
248	Ковров г, Олега Кошевого ул, 11	Отопление
249	Ковров г, Олега Кошевого ул, 13	Крыша
250	Ковров г, Олега Кошевого ул, 15	Отопление
251	Ковров г, Олега Кошевого ул, 3	Крыша
252	Ковров г, Олега Кошевого ул, 5	ХВС
253	Ковров г, Олега Кошевого ул, 6	ХВС, крыша
254	Ковров г, Олега Кошевого ул, 7	Фасад
255	Ковров г, Олега Кошевого ул, 9	электрика
256	Ковров г, Подлесная ул, 16	Фасад
257	Ковров г, Подлесная ул, 2	Отопление
258	Ковров г, Пугачева ул, 30	Крыша
259	Ковров г, Рунова ул, 34	Крыша
260	Ковров г, Свердлова ул, 80	Крыша
261	Ковров г, Сосновая ул, 22	Отопление, крыша
262	Ковров г, Социалистическая ул, 17	Крыша
263	Ковров г, Социалистическая ул, 3	Крыша
264	Ковров г, Социалистическая ул, 46	Лифт
265	Ковров г, Текстильная ул, 2а	Крыша
266	Ковров г, Тимофея Павловского ул, 4	Отопление, электрика, фасад
267	Ковров г, Тимофея Павловского ул, 8	ХВС
268	Ковров г, Тимофея Павловского ул, 9	Крыша
269	Ковров г, Урожайный проезд, 3	Крыша
270	Ковров г, Фрунзе ул, 11	Отопление
271	Ковров г, Фрунзе ул, 7	Отопление
272	Ковров г, Фрунзе ул, 8	Электрика
273	Ковров г, Чкалова пер, 3	Крыша
274	Ковров г, Щеглова ул, 43	Крыша
275	Гороховец г, Гагарина ул, 70	Крыша
276	Гороховец г, Гоголя ул, 14	Крыша
277	Гороховец г, Мира ул, 2	Крыша
278	Гороховец г, Мира ул, 27	Водоотведение, ХВС
279	Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Кооперативная ул, 28	Отопление
280	Гороховецкий р-н, Чулково п, Производственная ул, 4	Крыша
281	Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 2	Крыша
282	Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, 3	Крыша
283	Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 2	Фундамент
284	Гороховецкий р-н, Фоминки с, Совхозная ул, 2	Крыша
285	Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 1	Крыша
286	Гороховецкий р-н, Фоминки с, Чекунова ул, 3	электрика
287	Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Базарная ул, 33А	Крыша
288	Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 2	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
289	Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 9	Крыша
290	Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 7а	Крыша
291	Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 40	Крыша
292	Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Свердлова ул, 10	Крыша
293	Радужный г, 1-й кв-л, 15	ГВС
294	Радужный г, 1-й кв-л, 18	Крыша
295	Радужный г, 1-й кв-л, 20	Крыша
296	Радужный г, 1-й кв-л, 23	Крыша
297	Радужный г, 1-й кв-л, 26	Крыша
298	Радужный г, 1-й кв-л, 27	Крыша
299	Радужный г, 1-й кв-л, 29	ГВС, ХВС, крыша
300	Радужный г, 1-й кв-л, 31	Крыша
301	Радужный г, 1-й кв-л, 33	Фасад
302	Радужный г, 1-й кв-л, 5	Фасад
303	Радужный г, 3-й кв-л, 14	ГВС, ХВС
304	Радужный г, 3-й кв-л, 26	Крыша
305	Радужный г, 3-й кв-л, 7	Крыша
306	Радужный г, 3-й кв-л, 8	Крыша
307	Камешково г, Ленина ул, 7	Крыша
308	Камешково г, Молодежная ул, 7А	Крыша
309	Камешково г, Смурова ул, 6	Крыша
310	Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 5	Крыша
311	Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 7	Крыша
312	Камешковский р-н, Дружба п, Мира ул, 8	Крыша
313	Камешковский р-н, им Карла Маркса п, Карла Маркса ул, 4	Крыша
314	Камешковский р-н, Новки п, Ильича ул, 45	Крыша
315	Камешковский р-н, им Максима Горького п, Морозова ул, 6	Крыша
316	Камешковский р-н, им Максима Горького п, Шоссейная ул, 7	Крыша
317	Камешковский р-н, Второво с, Молодежная ул, 3	Крыша
318	Камешковский р-н, Второво с, Сосновая ул, 5	Электрика, фасад
319	Камешковский р-н, Мирный п, Садовая ул, 2	Крыша
320	Камешковский р-н, Мирный п, Садовая ул, 6	Крыша
321	Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 26	Крыша
322	Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 86	Крыша
323	Камешковский р-н, Мирный п, Школьная ул, 1	Крыша
324	Камешковский р-н, Сергеиха д, Карла Либкнехта ул, 76	Крыша
325	Киржач г, Гагарина ул, 33	Крыша
326	Киржач г, Гайдара ул, 13	Крыша
327	Киржач г, Магистральная ул, 1	Крыша
328	Киржач г, Магистральная ул, 5	Крыша
329	Киржач г, Молодежная ул, 7	Крыша
330	Киржач г, Павловского ул, 26	Крыша
331	Киржач г, Павловского ул, 28	Крыша
332	Киржач г, Привокзальная ул, 1а	Крыша
333	Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 17	Крыша
334	Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 5	Крыша
335	Киржачский р-н, Кипрево д, Новая ул, 2	Крыша
336	Киржачский р-н, Першино п, Октябрят проезд, 6	Крыша
337	Киржачский р-н, Першино п, Южный мкр, 6	Крыша
338	Киржачский р-н, Аленино д, Центральная ул, 58	Крыша
339	Ковровский р-н, Мелехово п, 2-я Набережная ул, 34	Крыша
340	Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 7	Крыша, фасад
341	Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 9	Крыша
342	Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 5	ХВС, крыша, фасад
343	Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Мира ул, 7	ХВС, крыша, фасад
344	Ковровский р-н, Санниково с, Центральная ул, 16	Фасад
345	Ковровский р-н, Санниково с, Центральная ул, 18	Фасад
346	Ковровский р-н, Санниково с, Центральная ул, 20	Водоотведение, отопление, ХВС, электрика
347	Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 53	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
348	Ковровский р-н, Малыгино п, Школьная ул, 66	Водоотведение, ГВС, ХВС, электрика, отопление
349	Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 3	Отопление, ХВС
350	Ковровский р-н, Первомайский п, 17	Крыша
351	Кольчугино г, 3 Интернационала ул, 64А	ГВС, ХВС, отопление
352	Кольчугино г, 5 Линия Ленинского поселка ул, 2	Крыша
353	Кольчугино г, Белая Речка п, Новая ул, 2	Крыша
354	Кольчугино г, Гагарина ул, 12	Крыша
355	Кольчугино г, Дружбы ул, 11	Крыша
356	Кольчугино г, Котовского ул, 30	Крыша
357	Кольчугино г, Луговая ул, 2	Крыша
358	Кольчугино г, Шмелева ул, 13	Крыша
359	Кольчугинский р-н, Бавлены п, Больничный пер, 3	Крыша
360	Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесной пер, 5	Крыша
361	Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 2	Крыша
362	Кольчугинский р-н, Есиплево с, Карпова ул, 1	Крыша
363	Кольчугинский р-н, Большевик п, Школьный пер, 3	Крыша
364	Кольчугинский р-н, Дубки п, Совхозная ул, 6	Крыша
365	Кольчугинский р-н, Металлист п, Центральная ул, 5	Крыша
366	Меленки г, Вокзальная ул, 3	Крыша
367	Меленки г, Муромская ул, 5	Крыша
368	Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 5	Крыша
369	Меленковский р-н, Тургенево д, Школьная ул, 1	Фасад
370	Муромский р-н, Панфилово с, Первомайская ул, 25	Крыша
371	Муром г, Владимирская ул, 2А	Крыша
372	Муром г, Владимирская ул, 6	Крыша
373	Муром г, Воровского ул, 71	Крыша
374	Муром г, Воровского ул, 75	Крыша
375	Муром г, Воровского ул, 90	Лифт
376	Муром г, Воровского ул, 91А	Крыша
377	Муром г, Заводская ул, 10	Крыша
378	Муром г, Карачаровское ш, 26	Крыша
379	Муром г, Карачаровское ш, 30В	ГВС, ХВС, отопление
380	Муром г, Карачаровское ш, 30Г	Отопление
381	Муром г, Кирова ул, 30	Крыша
382	Муром г, Ковровская ул, 10	Крыша
383	Муром г, Ковровская ул, 14	Крыша
384	Муром г, Ковровская ул, 16	Крыша
385	Муром г, Ковровская ул, 1А	Крыша
386	Муром г, Куйбышева ул, 1Г	Крыша
387	Муром г, Куйбышева ул, 24А	Лифт
388	Муром г, Куликова ул, 14	Крыша
389	Муром г, Куликова ул, 16	Крыша
390	Муром г, Куликова ул, 17	Крыша
391	Муром г, Ленина ул, 110	Крыша
392	Муром г, Ленина ул, 125	Крыша
393	Муром г, Ленина ул, 90	Крыша
394	Муром г, Ленинградская ул, 21	Крыша
395	Муром г, Ленинградская ул, 23	Крыша
396	Муром г, Ленинградская ул, 36/2	Лифт
397	Муром г, Льва Толстого ул, 94	Крыша
398	Муром г, Машинистов ул, 36А	Крыша
399	Муром г, Московская ул, 32	Крыша
400	Муром г, Московская ул, 37А	ХВС
401	Муром г, Московская ул, 75	ГВС
402	Муром г, Муромская ул, 1/2	Лифт
403	Муром г, Муромская ул, 1/3	Лифт
404	Муром г, Муромская ул, 10	Отопление
405	Муром г, Нежиловка мкр, 1б	Крыша
406	Муром г, Октябрьская ул, 69	Лифт
407	Муром г, Радиозаводское ш, 42	Отопление
408	Муром г, Революции пл, 4	Крыша
409	Муром г, Советская ул, 57А	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
410	Муром г, Совхозная ул, 11	Крыша
411	Муром г, Чкалова ул, 20А	Фасад
412	Муром г, Экземплярского ул, 45	Крыша
413	Муром г, Экземплярского ул, 90	Крыша
414	Муром г, Энгельса ул, 1	Крыша
415	Муром г, Энгельса ул, 21	Крыша
416	Муром г, Юбилейная ул, 56	Крыша
417	Муром г, Юбилейная ул, 58	Крыша
418	Петушинский р-н, Костерево г, 40 лет Октября ул, 18	Крыша
419	Петушинский р-н, Костерево г, Школьная ул, 25	Крыша
420	Петушки г, Лесная ул, 20	Фасад
421	Петушки г, Маяковского ул, 17	Крыша
422	Петушки г, Московская ул, 12	Отопление
423	Петушки г, Московская ул, 13	Фасад
424	Петушки г, Московская ул, 17	Крыша
425	Петушки г, Московская ул, 18	Крыша
426	Петушки г, Московская ул, 32	Крыша
427	Петушки г, Московская ул, 7	Крыша
428	Петушки г, Покровка ул, 19	Крыша
429	Петушки г, Строителей ул, 24а	Крыша
430	Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 18	Крыша
431	Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, 35	Крыша
432	Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 124	Крыша
433	Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, 1	Крыша
434	Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменовская ул, 10	Крыша
435	Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменовская ул, 14	Фасад
436	Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 26	Крыша
437	Петушинский р-н, Городищи п, Ленина ул, 24	Фасад
438	Петушинский р-н, Городищи п, Советская ул, 12	Электрика
439	Петушинский р-н, Панфилово д, Центральная ул, 1	Крыша
440	Петушинский р-н, Панфилово д, Центральная ул, 2	Крыша
441	Петушинский р-н, Сосновый Бор п, Центральная ул, 7	Крыша
442	Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, 7	Крыша
443	Петушинский р-н, Пекша д, Центральная ул, 7	Крыша
444	Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 1	Крыша
445	Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Заводская 3-я ул, 4	Крыша
446	Селивановский р-н, Новый Быт п, Молодежная ул, 4	Водоотведение
447	Селивановский р-н, Драчево с, Южная ул, 4	электрика
448	Селивановский р-н, Костенец п, 5	Крыша
449	Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 2	Крыша
450	Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 6	Отопление
451	Селивановский р-н, Новлянка п, Молодежная ул, 9	ХВС, электрика
452	Селивановский р-н, Надеждино д, Школьная ул, 10	Электрика
453	Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 7А	Крыша
454	Собинский р-н, Лакинск г, Парижской Коммуны ул, 26	Крыша
455	Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 20	Крыша
456	Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 9	Крыша
457	Собинка г, Гоголя ул, 1	Крыша
458	Собинка г, Лакина ул, 9	Крыша
459	Собинка г, Мира ул, 1А	Крыша, отопление
460	Собинка г, Мира ул, 6	Подвал
461	Собинка г, Центральная ул, 20	Крыша
462	Собинка г, Центральная ул, 21	Крыша
463	Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 134	Крыша
464	Собинский р-н, Ставрово п, Школьная ул, 2	Крыша
465	Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 7	Крыша
466	Собинский р-н, Асерхово п, Железнодорожная ул, 5	Отопление
467	Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 2	Крыша
468	Собинский р-н, Колокша п, Заречная ул, 17	Крыша
469	Собинский р-н, Колокша п, Заречная ул, 18	Крыша
470	Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 1 корп. 5	Крыша
471	Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 6 корп. 1	Крыша
472	Собинский р-н, Ундольский п, Школьная ул, 2	Крыша

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
473	Собинский р-н, Ундольский п, Школьная ул, 32	Крыша
474	Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, 3	Крыша
475	Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 1	Крыша
476	Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 1	Водоотведение
477	Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 2	Водоотведение
478	Собинский р-н, Черкутино с, Им В.А.Солоухина ул, 3	Водоотведение
479	Судогда г, Малый Советский пер, 14а	Водоотведение, отопление, ХВС, крыша
480	Судогда г, Пролетарская ул, 17	Крыша
481	Судогда г, Пролетарская ул, 19	Крыша
482	Судогда г, Текстильщиков ул, 10в	Крыша
483	Судогда г, Текстильщиков ул, 3	Крыша
484	Судогда г, Текстильщиков ул, 4	Крыша
485	Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 3	Крыша
486	Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 4	Крыша
487	Судогодский р-н, Андреево п, Первомайская ул, 6	Крыша
488	Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 8	Крыша
489	Судогодский р-н, Чамерево с, Первомайская ул, 6	Водоотведение
490	Судогодский р-н, им Воровского п, Воровского ул, 55а	Крыша
491	Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 26	Крыша
492	Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 23	Крыша
493	Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 25	Крыша
494	Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 27	Крыша
495	Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 22	Крыша
496	Суздальский р-н, Боголюбово п, Пушкина ул, 31	Крыша
497	Суздальский р-н, Боголюбово п, Садовая ул, 30А	Крыша, фасад
498	Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 8	Крыша
499	Суздальский р-н, Садовый п, Центральная ул, 3а	Крыша
500	Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 42	Водоотведение, отопление, ХВС, электрика
501	Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 50	Крыша
502	Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 65	Фасад
503	Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 32	Подвал
504	Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 32А	Подвал
505	Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 16	Подвал
506	Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 18	ГВС, ХВС
507	Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 20	Подвал
508	Юрьев-Польский г, Вокзальный пер, 1	Подвал
509	Юрьев-Польский г, Герцена ул, 3	Фасад
510	Юрьев-Польский г, Герцена ул, 4	Фасад
511	Юрьев-Польский г, Горького ул, 13	Отопление
512	Юрьев-Польский г, Горького ул, 15	Отопление
513	Юрьев-Польский г, Горького ул, 3	Фасад
514	Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 34	Крыша
515	Юрьев-Польский г, Луговая ул, 1	Подвал
516	Юрьев-Польский г, Луговая ул, 37А	ГВС, ХВС
517	Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 17	Подвал

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
518	Юрьев-Польский г, Покровская ул, 52	ГВС, ХВС
519	Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 16	ХВС
520	Юрьев-Польский г, Революции ул, 12	ГВС, ХВС
521	Юрьев-Польский г, Садовый пер, 11	Подвал
522	Юрьев-Польский г, Садовый пер, 33	ГВС, ХВС
523	Юрьев-Польский г, Свободы ул, 129	ГВС, ХВС
524	Юрьев-Польский г, Связистов ул, 5	Фасад
525	Юрьев-Польский г, Советская пл, 10	Отопление
526	Юрьев-Польский г, Советская пл, 8	Отопление
527	Юрьев-Польский г, Станционная ул, 1А	Фасад
528	Юрьев-Польский г, Строителей ул, 2А	Водоотведение
529	Юрьев-Польский г, Чехова ул, 1	Подвал
530	Юрьев-Польский г, Чехова ул, 12	Фасад
531	Юрьев-Польский г, Чехова ул, 21	электрика
532	Юрьев-Польский г, Чехова ул, 23А	Подвал
533	Юрьев-Польский г, Чехова ул, 25	Электрика
534	Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7Б	Отопление
535	Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 118	Отопление
536	Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 27	Фасад
537	Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 29	Фасад
538	Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 91	Водоотведение
539	Юрьев-Польский г, Школьная ул, 4А	Фасад
540	Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1А	ХВС
541	Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 3	Крыша
542	Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 5	Водоотведение, ХВС
543	Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Центральная ул, 7	ХВС
544	Юрьев-Польский р-н, Андреевское (Небыловское МО) с, Гагарина ул, 2	Фасад
545	Юрьев-Польский р-н, Андреевское (Небыловское МО) с, Гагарина ул, 3	Фасад
546	Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Октябрьская ул, 2	Водоотведение
547	Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 79	Крыша
548	Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 2	Подвал

№ п/п	Адрес МКД	Вид капитального ремонта
549	Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, 1	Подвал
550	Юрьев-Польский р-н, Сима с, Молодежная ул, 25	Водоотведение, подвал

Капитальный ремонт в действии (фотоотчет)



Фасад многоквартирного дома №2а по улице Большие Ременники в городе Владимир **ДО** капитального ремонта



Фасад многоквартирного дома №2а по улице Большие Ременники в городе Владимир **ПОСЛЕ** капитального ремонта



Фасад многоквартирного дома №3 по Ерофеевский спуск в городе Владимир **ДО** капитального ремонта



Фасад многоквартирного дома №3 по Ерофеевский спуск в городе Владимир **ПОСЛЕ** капитального ремонта



Фасад многоквартирного дома №2 по улице им. В.А. Солоухина в селе Черкутино Собинского района **ДО** капитального ремонта



Фасад многоквартирного дома №2 по улице им. В.А. Солоухина в селе Черкутино Собинского района **ПОСЛЕ** капитального ремонта




Кровля многоквартирного дома №155 по улице Лакина в городе Владимир **ДО** капитального ремонта



Кровля многоквартирного дома №155 по улице Лакина в городе Владимир **ПОСЛЕ** капитального ремонта

Капитальный ремонт в действии (фотоотчет)

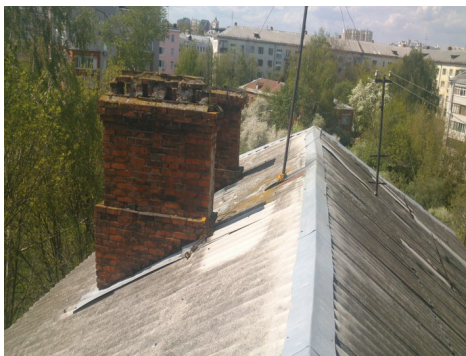


Кровля многоквартирного дома №23 по улице Никитская в городе Владимир ДО капитального ремонта



Кровля многоквартирного дома №23 по улице Никитская в городе Владимир ПОСЛЕ капитального ремонта




Кровля многоквартирного дома №1 по улице Строителей в поселке Садовый Суздальского района ДО капитального ремонта

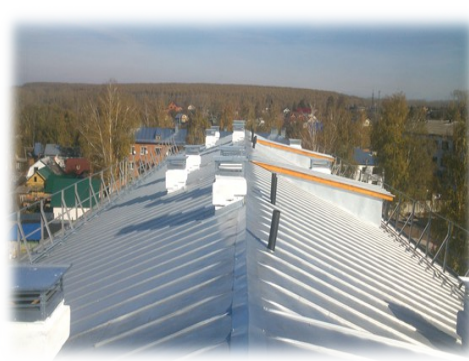

Переустройство кровли многоквартирного дома №1 по улице Строителей в поселке Садовый Суздальского района



Лифт многоквартирного дома №90 по улице Воровского в городе Муроме ДО капитального ремонта

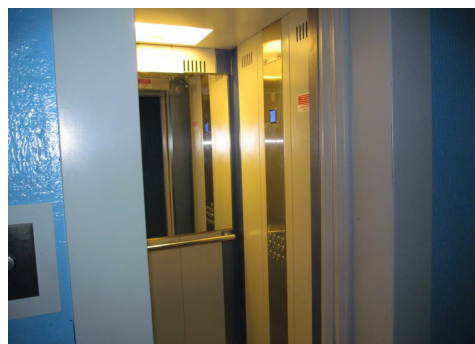

Лифт многоквартирного дома №90 по улице Воровского в городе Муроме ПОСЛЕ капитального ремонта



Внутридомовые инженерные системы многоквартирного дома №78 по улице Лопатина в городе Ковров ДО капитального ремонта



Внутридомовые инженерные системы многоквартирного дома №78 по улице Лопатина в городе Ковров ПОСЛЕ капитального ремонта

Капитальный ремонт в действии (фотоотчет)



Внутридомовые инженерные системы многоквартирного дома №8 корп. 1 по улице Терешковой в городе Александрове **ДО** капитального ремонта



Внутридомовые инженерные системы многоквартирного дома №8 корп. 1 по улице Терешковой в городе Александрове **ПОСЛЕ** капитального ремонта



Система электроснабжения многоквартирного дома №3 по улице Чекунова в селе Фоминки **ПОСЛЕ** капитального ремонта



Отмостка многоквартирного дома №32 по улице Артиллерийская в городе Юрьев-Польский **ПОСЛЕ** капитального ремонта

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Владимирской
области»**

по итогам деятельности за 2015 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правлению некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Владимирской области»
о бухгалтерской отчетности
Фонда капитального ремонта ВО
по итогам деятельности
за 2015 год

Аудируемое лицо – Фонд капитального ремонта ВО

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»

600017, г.Владимир, ул.Мира, д.29

Свидетельство серия 33 №001942451 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1133300001163 от 17.09.2013г. выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Владимирской области.

Аудитор – ООО «АНИТ-Аудиторские услуги»

Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ-Аудиторские услуги»

600000, г.Владимир, ул.Столетовых, д.9

Тел/факс (4922) 32-14-02

Свидетельство серия 50 №011116288 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1083327004309 от 29.08.2008г. выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владимира.

ООО «АНИТ-Аудиторские услуги» является членом саморегулируемой организации «Аудиторская Палата России» и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 28 декабря 2009г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 10801057252.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **Фонд капитального ремонта ВО** состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на **31 декабря 2015 года**;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Фонда капитального ремонта ВО** по состоянию на **31 декабря 2015 года**, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за **2015 год** в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «АНИТ-Аудиторские услуги»



И.В. Германова

16 июня 2016 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	21062620		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	ИНН	3329999430		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес)	600017, Владимирская обл, Владимир г, Мира ул, дом № 29	по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 923	2 851	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 923	2 851	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 182	42	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	617 406	499 330	517
	в том числе:				
	Плательщики взносов на капитальный ремонт МКД		617 207	497 750	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 098 057	628 291	28 168
	в том числе:				
	Платежи на капитальный ремонт МКД		1 095 594	624 897	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 717 645	1 127 663	28 685
	БАЛАНС	1600	1 721 568	1 130 515	28 685

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 616 245	1 129 971	28 651
	в том числе:				
	Взносы на капитальный ремонт собственники МКД		1 515 154	1 000 713	-
	Софинансирование капитального ремонта		60 002	120 056	-
	Проценты от НСО счет регионального оператора		52 733	1 877	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 616 245	1 129 971	28 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	105 324	544	33
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	105 324	544	33
	БАЛАНС	1700	1 721 568	1 130 515	28 685



31 марта 2016

Пахомов Евгений Львович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
21062620		
3329999430		
65.23		
20400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	46	8
	Себестоимость продаж	2120	(6)	(1)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40	7
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40	7
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 273	1 645
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 313	1 652
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(250)	(50)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 063	1 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 063	1 602
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Пахомов Евгений Львович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
21062620		
3329999430		
65.23		
20400		16
▪ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 474 848	765 120
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44	9
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Взносы на капитальный ремонт МКД	4114	1 420 292	611 856
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту	4115	54 512	153 255
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 091 739)	(168 519)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 009)	(12 615)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 501)	(13 773)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(266)	(37)
Оплата подрядчикам за выполненные работы по капитальному ремонту МКД	4125	(1 004 574)	(142 094)
Возвраты средств собственникам МКД	4126	(50 123)	-
Возврат средств на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту МКД	4127	(266)	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	383 109	596 601
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
21062620		
3329999430		
65.23		
20400		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 129 971	28 651
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	1 602 689	1 267 112
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	46	7
Прочие	6250	6 106	1 608
Всего поступило средств	6200	1 608 841	1 268 727
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 057 307)	(144 466)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(1 057 307)	(144 466)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(36 242)	(14 590)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(20 878)	(13 736)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(56)	(29)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 041)	(825)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(13 267)	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3 167)	(5 486)
Прочие	6350	(25 478)	(2 866)
Всего использовано средств	6300	(1 122 194)	(167 408)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 616 617	1 129 971



Руководитель

(подпись)

Пахомов Евгений Львович

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 923	2 851	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 182	42	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	617 406	499 330	517
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 098 057	628 291	28 168
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 721 568	1 130 515	28 685
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	105 324	544	33
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	105 324	544	33
Стоимость чистых активов	-	1 616 245	1 129 971	28 652

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	2 851	-	1 072	-	-	-	3 923	-
	5210	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	2 851	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2015г.	895	-	121	-	-	-	1 016	-
	5211	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	895	-
Другие виды основных средств	5202	за 2015г.	52	-	-	-	-	-	52	-
	5212	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	52	-
Транспортные средства	5203	за 2015г.	1 904	-	573	-	-	-	2 477	-
	5213	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	1 904	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2015г.	-	-	378	-	-	-	378	-
	5214	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	-	1 072	-	(1 072)	-
	5250	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе: Межсетевой экран	5241	за 2015г.	-	121	-	121	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Тепловизор	5242	за 2015г.	-	378	-	378	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
LADA LARGUS серебро 2	5243	за 2015г.	-	573	-	573	-
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015г.	42	-	3 517	(1 377)	-	-	X	2 182	-
	5420	за 2014г.	-	-	42	-	-	-	X	42	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	8	-	3 517	(1 371)	-	-	-	2 154	-
	5421	за 2014г.	-	-	8	-	-	-	-	8	-
	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2015г.	35	-	-	(7)	-	-	-	28	-
	5423	за 2014г.	-	-	35	-	-	-	-	35	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2015г.	499 330	-	710 035	-	(591 950)	-	-	-	-	-	617 406
	5530	за 2014г.	512	-	499 330	-	(512)	-	-	-	-	-	499 330
	5511	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5512	за 2015г.	1 366	-	37 805	-	(1 366)	-	-	-	-	-	38 494
	5532	за 2014г.	512	-	1 366	-	(512)	-	-	-	-	-	1 366
	5513	за 2015г.	497 764	-	672 229	-	(7 508)	-	-	-	-	-	1 169 944
	5533	за 2014г.	-	-	497 964	-	-	-	-	-	-	-	497 964
Итого	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2015г.	499 330	-	710 035	-	(591 950)	-	X	X	X	X	617 406
	5520	за 2014г.	512	-	499 330	-	(512)	-	X	X	X	X	499 330

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2015г.	544	215 272	-	-	(39)	-	-	-	105 318
	5580	за 2014г.	33	987	-	-	(33)	-	-	-	544
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2015г.	443	105 768	-	-	(7)	-	-	-	105 318
	5581	за 2014г.	33	885	-	-	(33)	-	-	-	443
	5562	за 2015г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5563	за 2015г.	100	205	-	-	(305)	-	-	-	-
	5583	за 2014г.	1	101	-	-	-	-	-	-	100
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5568	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5569	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5570	за 2015г.	544	215 272	-	-	(39)	X	X	X	105 318
	5570	за 2014г.	33	987	-	-	(33)	X	X	X	544

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	(7)	(1)
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	(7)	(1)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(7)	(1)

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	27 533		-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	27 533		-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
за 2015г. за 2014г.				
за 2015г. за 2014г.				

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 30 (Смещенная) листов

Генеральный директор И.В. Германова



ОТЧЕТ

об использовании субсидии
(представленной в виде единовременного и ежегодного взноса)
некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Владимирской области" в соответствии с Соглашением от 02.03.2015г. № 87
о предоставлении субсидии из бюджета Владимирской области
по состоянию на "01" января 2016 г.

Наименование показателя	Суммы, тыс.руб.
Остаток средств на 01.01.2015	3 402,3
Поступило средств	35 655,3
1. Субсидии в виде единовременного имущественного взноса	
2. Субсидии в виде ежегодного имущественного взноса	27 532,8
3. Прочие доходы	8 122,5
Использовано средств	36 594,7
в том числе по видам расходов:	
в целях финансового обеспечения уставной деятельности	1 990,9
в том числе:	
Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов	1 946,5
Приобретение и установка программного обеспечения	44,4
Разработка официального сайта регионального оператора, других информационных ресурсов по реализации программы капитального ремонта в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	
Оплата расходов по разработке методологии, критериев, стоимостных, качественных и иных показателей реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов	
в целях финансового обеспечения текущей деятельности	34 603,8
Оплата труда сотрудников и начисления на выплаты по оплате труда	16 574,0
Оплата служебных командировок	55,6
Оплата услуг связи, в том числе почтовой	651,1
Транспортные услуги	
Аудиторские услуги	60,0
Оплата работ, услуг по содержанию имущества	2 041,3
Уплата налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	4 612,1
Поддержание официального сайта регионального оператора, других информационных ресурсов по реализации программы капитального ремонта в информационно-коммуникационной сети "Интернет"	37,4
Оплата расходов на подписные печатные издания	
Оплата расходов на изготовление информационных буклетов и рекламных материалов	60,1
Оплата расходов на участие сотрудников в семинарах, повышение квалификации	80,8
Оплата расходов на обеспечение охраны помещений, занимаемых региональным оператором	
Оплата расходов по открытию и ведению расчетного счета, осуществление других банковских операций	3,9
Оплата расходов по осуществлению государственной регистрации	9,7
Оплата расходов по аренде помещений	163,7
Оплата расходов на выставление платежных документов собственникам помещений в многоквартирных домах в целях уплаты взносов на капитальный ремонт	10 132,0
Оплата государственной пошлины и выписок о зарегистрированных правах собственности на помещения в многоквартирных домах в целях взыскания задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт	122,1
Остаток средств на 01.01.2016г.	2 462,9

Генеральный директор Фонда капитального ремонта БО
Главный бухгалтер Фонда капитального ремонта БО

С.Е. Горшкова
М.М. Федькина
